

Plan de Management Projet

Phase 2 — Planification | Projet : Refonte Web

Document maître — Référentiel PMO Time'Eats

Champ	Valeur	Champ	Valeur
Nom du projet	Refonte Web	Version PMP	1.0
Chef de projet	M. X	Date	22/04/2026
Sponsor	Mme Y — DSI Time'Eats	ESN partenaire	Sopra Steria (forfait 400 j/h)
Budget total	300 K€	Durée	22/04 — 30/09/2026 (6 mois)
Approche	Hybride (cadre prédictif + Scrum)	Statut	En cours (avancement 8 %)

1 — Introduction et cadrage

1.1 Historique et versions

Version	Date	Modifications	Auteur
v0.1	10/04/2026	Trame initiale — cadrage par le CP	M. X
v0.5	18/04/2026	Revue interne DSI (budget, jalons, risques)	M. X / Mme Y
v0.9	20/04/2026	Intégration retours Marketing et RSSI	M. X
v1.0	22/04/2026	Version de référence validée en COPIL	Mme Y (sponsor)

1.2 Objet du document

Ce Plan de Management Projet (PMP) décrit **comment** le projet *Refonte Web* sera exécuté, surveillé, contrôlé et clôturé. Il intègre les plans subsidiaires (périmètre, délais, coûts, qualité, ressources, communication, risques, approvisionnements, parties prenantes, changements) et les **lignes de base** (scope, échéancier, coûts) qui serviront de référentiel de mesure de performance. Le PMP est destiné à la DG, à la DSI, au chef de projet, à l'équipe projet, à Sopra Steria et au PMO. Il est mis à jour à chaque événement majeur (changement de scope, dépassement de seuil d'alerte, révision de baseline) et au minimum mensuellement.

1.3 Contexte du projet

Time'Eats vise pour 2026–2027 : 1 M de nouveaux clients, 10 000 restaurants partenaires, 25 % de part de marché. Le site **timeats.fr** actuel n'est ni *responsive*, ni conforme RGAA, ni interfaçable avec le futur écosystème (CRM, apps mobiles). La refonte web est la **pièce angulaire** de la transformation digitale 2026 : socle commun de l'écosystème via une API publique, levier marketing et commerce, et industrialisation de la production éditoriale par un CMS contributeur. Le projet est inscrit au portefeuille DSI avec un score de priorisation de **3,80 / 5,00** (RAG **Vert**).

1.4 Analyse SWOT

Forces (S)	Faiblesses (W)
• Sponsoring fort DSI + DG sur la transformation digitale • Équipe Tech Lead expérimentée (Next.js, design system) • Budget sécurisé (300 K€ verrouillés en COPIL) • Forfait ESN Sopra Steria (transfert risque dépassement) • Référent Marketing engagé (15 % contractualisés)	• Dépendance projet Office 365 (SSO espace client) • Équipe DSI déjà très sollicitée par 11 projets simultanés • Pas de design system existant (à créer) • Compétences accessibilité (RGAA) externes uniquement • Historique de retards sur les projets web précédents
Opportunités (O)	Menaces (T)
• API publique réutilisable par CRM et apps mobiles (mutualisation) • Vitrine projet PMO (référence pour les autres projets) • Préparer campagne marketing nationale Q4 2026 • Réduction TCO de 25 % sur 12 mois • Audit RGAA valorisable (image responsable + marchés publics)	• Glissement du projet Office 365 (impact SSO) • Dérive de scope sur CMS (contenu legacy) • Cyberattaque (site vitrine = surface d'attaque) • Non-conformité RGAA $\Rightarrow$ sanction CNIL + image • Concurrents en avance sur la transition digitale


1.5 Enjeux et objectifs SMART — Arbre des objectifs

Chaque objectif est formulé selon la méthode **SMART** (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel).

N°	Enjeu	Objectif SMART	Indicateur	Échéance
O1	Croissance commerciale	Atteindre +30 % de trafic organique vs T1 2026	Sessions / mois Analytics	M+6 post Go-Live
O2	Expérience client	Lighthouse Performance et A11y ≥ 90 sur 10 parcours-clés	Score Lighthouse	Go-Live (30/09/2026)
O3	Industrialisation	Réduire de 5j à < 30 min le délai de mise en ligne d'un contenu	Temps moyen CMS	M+3 post Go-Live
O4	Écosystème digital	Livrer API publique REST v1 documentée (OpenAPI 3)	API en production	30/06/2026 (J2)
O5	Conformité & éthique	Atteindre RGAA 4.1 niveau AA et OWASP ASVS niveau 2	Rapports d'audit	31/08/2026 (J4)
O6	TCO	Baisser le coût total de possession de 25 % à 12 mois	Comptabilité analytique	M+12

✓ Recommandation


L'arbre des objectifs ci-dessous (généré par PlantUML) décompose l'objectif global « soutenir la croissance nationale » en cinq familles d'objectifs opérationnels mesurables. Il sert de support de négociation avec le sponsor et de fil rouge en COPIL.

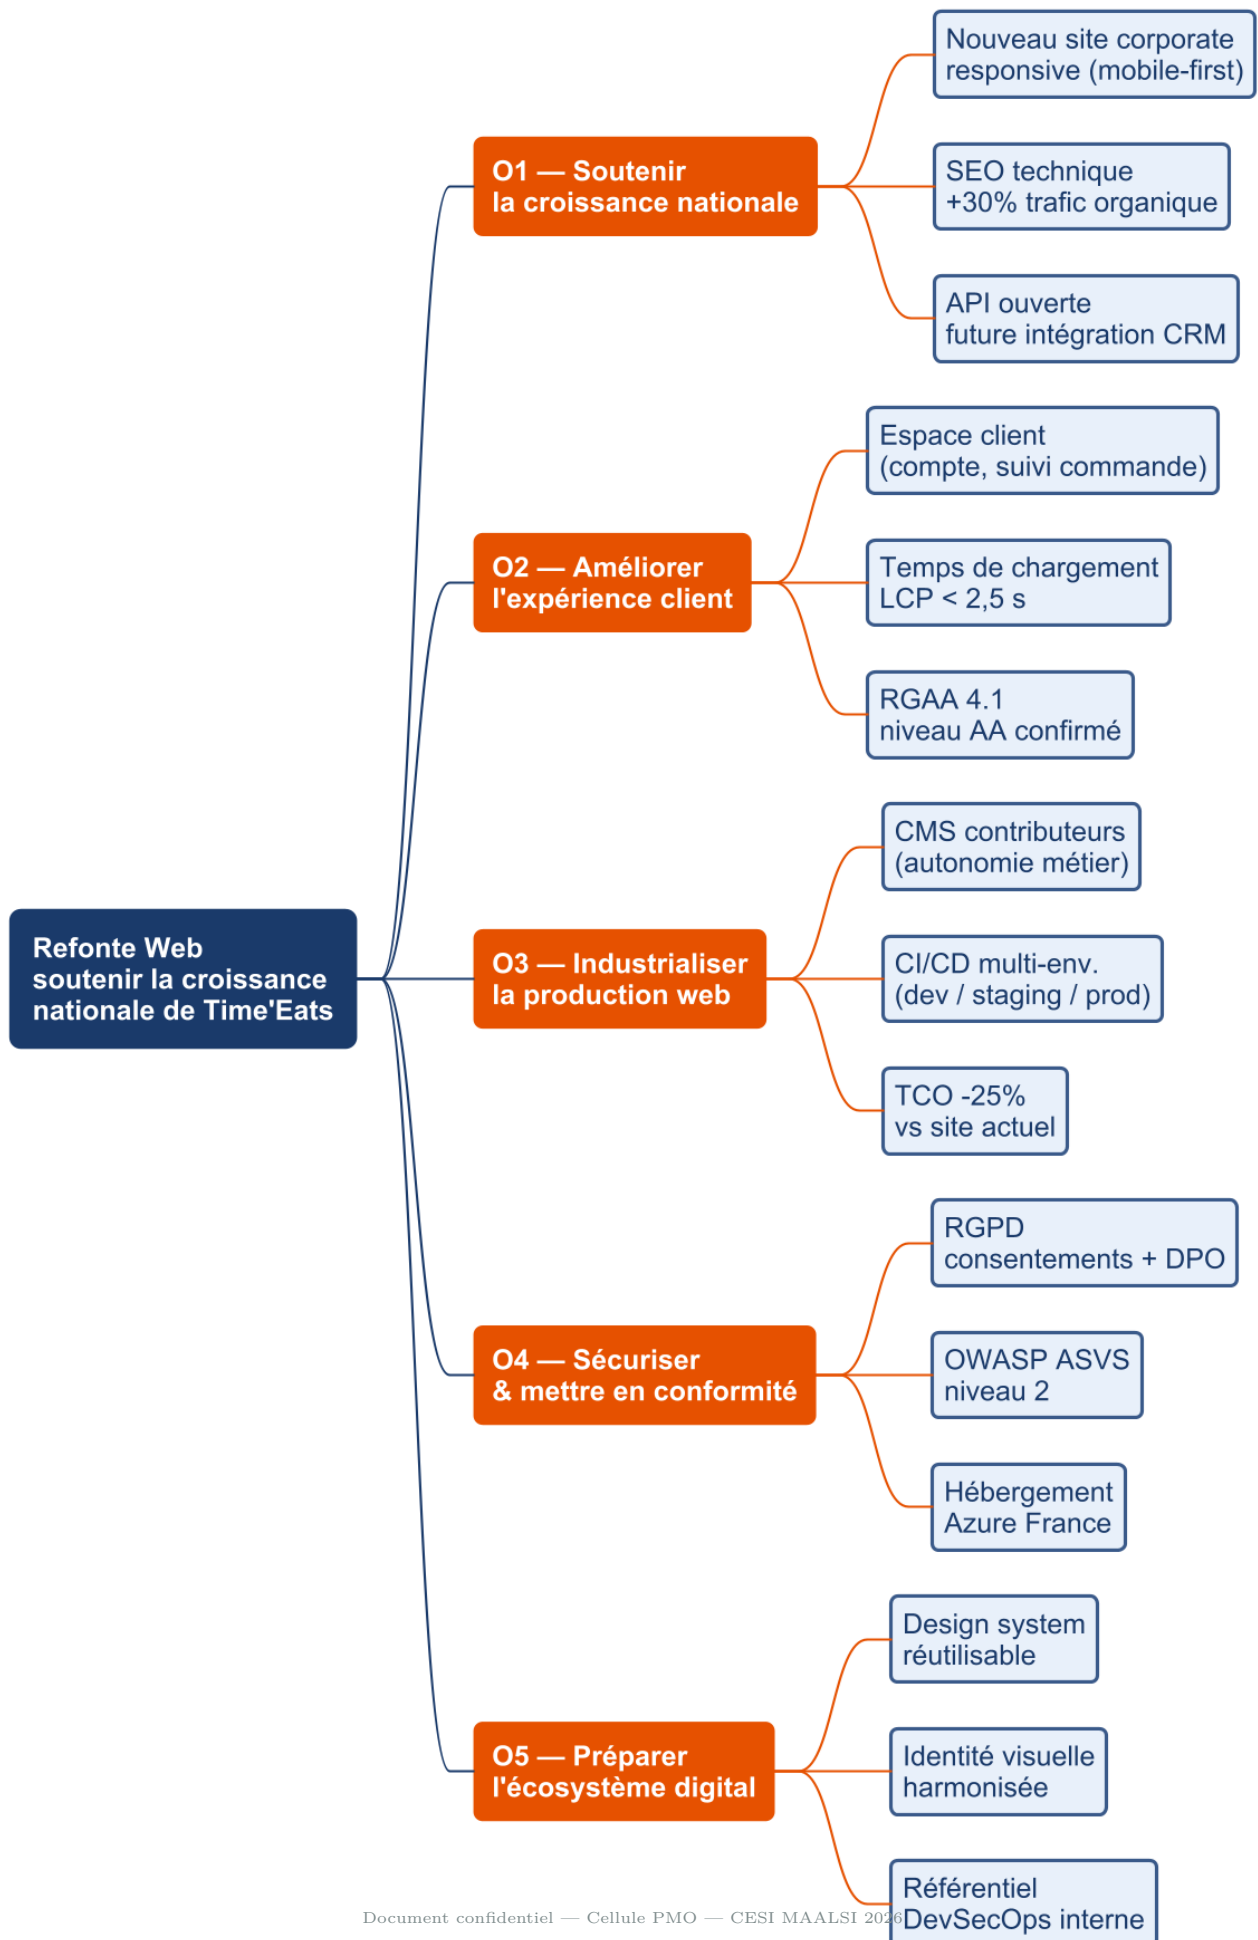

Arbre des objectifs — Refonte Web (source : arbre_objectifs_refonte_web.puml)

1.6 Triangle d'Or — arbitrage Coût / Délai / Qualité

Le **Triangle d'Or** formalise les contraintes croisées du projet et sert d'outil de négociation : toute modification d'un axe impacte les deux autres.

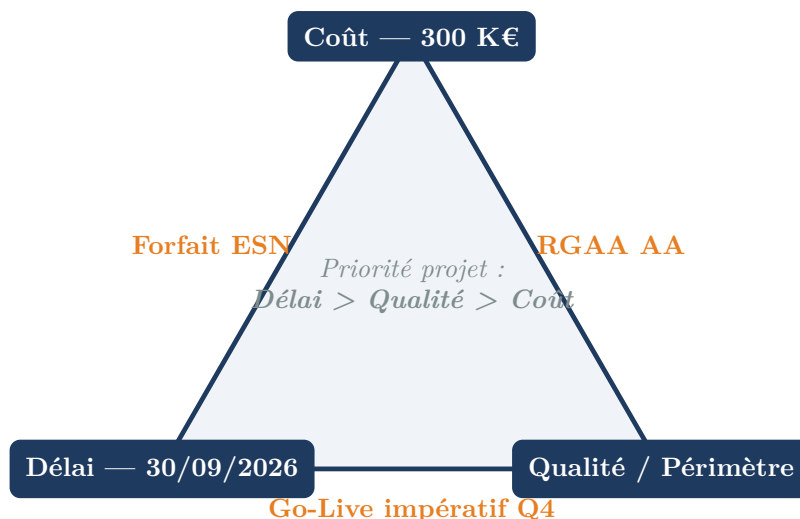

Règles d'arbitrage :

Si pression sur...	Alors arbitrage retenu
Délai (Go-Live)	Priorité absolue : aucun glissement de J5 toléré. Si dépassement risqué, réduire le périmètre fonctionnel (espace client minimal, CMS Phase 2) plutôt que repousser.
Coût (300 K€)	Enveloppe ferme. Tout dépassement requiert avenant COPIL + financement complémentaire DG.
Qualité / Périmètre	Le socle RGAA AA, OWASP ASVS 2 et API v1 documentée est non négociable . Les fonctionnalités secondaires (newsletter, blog, témoignages) peuvent glisser en Phase 2 si pression budget ou délai.

2 — Périmètre du projet (Scope)

2.1 Périmètre fonctionnel, technique et géographique

Dimension	Couverture
Fonctionnel	Site corporate vitrine + CMS contributeur + espace client (compte, suivi commande, factures, préférences) + API publique REST v1 (catalogue, recherche, contact, comptes).
Technique	Front : Next.js 14, TypeScript ; Back : Node.js (NestJS) + PostgreSQL ; Headless CMS (Strapi ou Directus, à arbitrer en J2) ; Auth : SSO Office 365 (repli IdP local Keycloak) ; Hébergement : Azure West Europe (Paris) ; CI/CD : GitHub Actions + Azure Pipelines ; APM : Application Insights.
Géographique	Marché français en V1 ; <i>i18n</i> -ready (architecture multilingue prête, langues additionnelles hors scope V1).
Utilisateurs	Visiteurs prospects, clients particuliers (B2C), contributeurs Marketing/Communication (CMS), équipes Commerce (lecture API), Service Client (consultation comptes).

2.2 Domaines inclus (IN)

- Audit UX/SEO du site actuel + benchmarks concurrence.
- Création du **design system** (composants, tokens, librairie Storybook).
- Refonte de **10 templates de page** (accueil, catégorie, produit, recherche, contact, blog, CGU, mentions légales, profil, suivi commande).
- CMS contributeur : gestion contenus, médias, SEO meta, multi-utilisateurs avec rôles.
- Espace client : création compte, login (SSO ou local), profil, historique commandes (lecture API CRM-prêt), factures, préférences.
- API publique REST v1 : 12 endpoints documentés OpenAPI 3 (catalogue, recherche, contact, comptes, sessions, articles).
- SEO technique : balisage Schema.org, sitemap, robots, Core Web Vitals, redirections legacy.
- Conformité **RGAA 4.1 niveau AA** : audit avant Go-Live, mise en accessibilité.
- Conformité **RGPD** : registre traitements, consentements, droits d'accès / suppression.
- Sécurité **OWASP ASVS niveau 2** : audit avant Go-Live, durcissement.
- **CI/CD** multi-environnement (dev / staging / prod) avec promotion automatique sur tag.
- **Monitoring** : Application Insights, alerting sur SLO (uptime $\geq 99,5\%$, error rate $< 1\%$).
- Documentation utilisateur (contributeurs CMS) et technique (équipe Run).

2.3 Domaines exclus (OUT)

- Refonte CRM (projet dédié, démarrage juin 2026).
- Applications mobiles Clients et Fournisseurs (projets séparés).
- Tunnel de commande B2B avancé (Phase 2 post-Go-Live).
- Back-office logistique et gestion des stocks (couvert par le futur CRM).
- Refonte de l'intranet collaborateur Time'Eats.
- Migration des contenus legacy antérieurs à 2024 (à statuer en avenant si demandé).
- Versions multilingues (anglais, espagnol) : architecture *i18n*-ready prête, traduction hors scope.

3 — Gouvernance et organisation

3.1 Sponsor


Sponsor exécutif : Mme Y, Directrice des Systèmes d'Information (DSI). Garant politique, financier et arbitre des escalades. Présidente du COPIL mensuel.

Autorité ultime : M. Z, Directeur Général — arbitrage en cas de dépassement de budget ou de glissement de jalon majeur.

3.2 Équipe projet

Membre	Rôle	Mission	Aff.
M. X	Chef de projet	Pilotage global, COPIL, gestion ESN	50 %
M. A	Tech Lead Front	Architecture front, design system, code review	60 %
M. B	Dev Back-End	API, intégrations CRM-ready, sécurité applicative	60 %
Mme C	UX/UI Designer	Wireframes, maquettes Figma, design system	80 /30 %
M. D	DevOps	Pipeline CI/CD, environnements, monitoring	20 %
Mme E	RSSI	Validation sécurité, audit OWASP	10 %
Mme F	Resp. Marketing	Référent métier MOA, validation contenus	15 %
M. G	Lead tech ESN	Architecture cible, sécurisation forfait	80 j/h
Sopra Steria	ESN forfait	2 devs front + 2 devs back + UX expert + QA	320 j/h

3.3 Organigramme projet

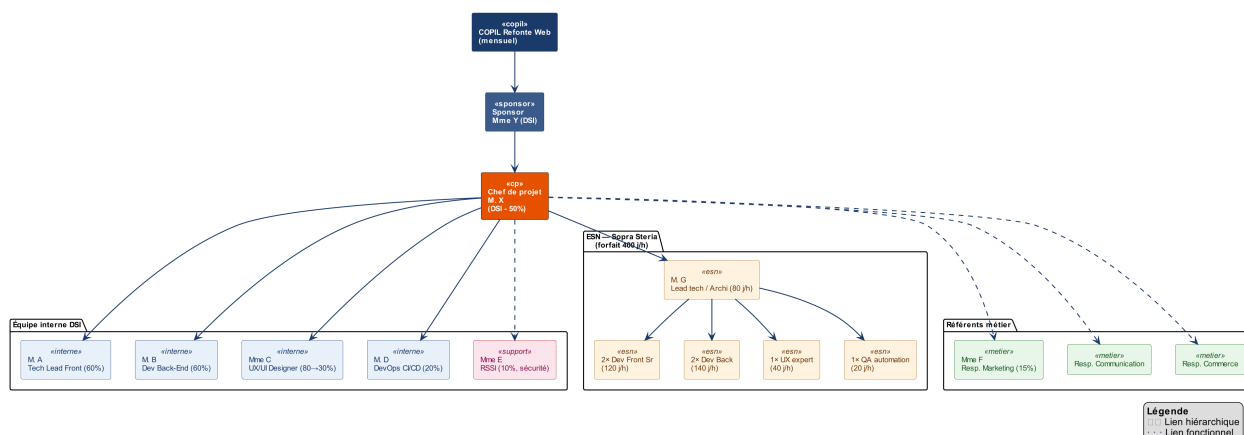

Organigramme projet Refonte Web (source : `organigramme_refonte_web.puml`)


3.4 Matrice RACI

La matrice RACI complète couvrant les 5 phases du projet est rédigée dans le document compagnon **P1-04 — Matrice RACI**. Règle PMO : un seul **A** par activité, au moins un **R** par activité.

3.5 Instances de pilotage

Instance	Fréquence	Participants & objectifs
COFIL Refonte Web	Mensuel (3 ^e mardi 9h)	Sponsor DSI + CP + Tech Lead + Lead ESN + Resp. Marketing. Validation jalons, arbitrage écarts (> 5 % budget ou > 10 j délai).
Revue de sprint (démon)	Toutes les 2 semaines (vendredi 14h)	Équipe projet complète + référents métier. Démon incrément + rétrospective Scrum.
Daily Scrum	Quotidien (9h15 — 15 min)	Équipe technique (interne + ESN sur sprint). Lever les blocages.
Point hebdo CP / ESN	Hebdomadaire (mercredi 17h)	M. X + M. G. Suivi forfait, livrables, alertes.
Comité Stratégique DSI	Mensuel	Reporting du portefeuille (le projet y est consolidé via le Cockpit DSI).

3.6 Cartographie des parties prenantes (Pouvoir × Intérêt)

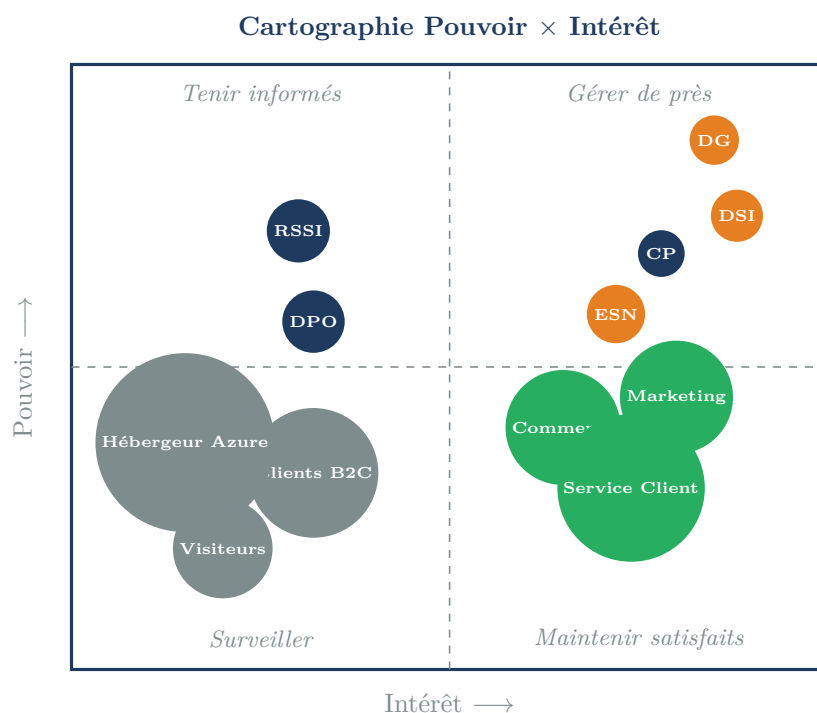

Stratégies de communication associées : *Gérer de près* = COFIL, briefings; *Tenir informés* = newsletters internes; *Maintenir satisfaits* = revues de sprint, démos; *Surveiller* = communication broadcast, FAQ.

4 — Planification et livrables

4.1 PBS — Product Breakdown Structure

Le PBS décompose le **produit livré** (par opposition au WBS qui décompose le **travail**). Il sert de référence pour la recette et le transfert run.

Code PBS	Composant produit	Description
PBS-1	Site corporate	10 templates de page, navigation, recherche, SEO
PBS-2	Espace client	Compte, login, profil, historique, factures
PBS-3	CMS contributeur	Backoffice headless, gestion contenus + médias + SEO meta
PBS-4	API publique REST v1	12 endpoints OpenAPI 3, SDK JS optionnel
PBS-5	Design system	Librairie Storybook (composants + tokens + guidelines)
PBS-6	Pipeline CI/CD	Environnements dev/staging/prod + promotion + tests
PBS-7	Documentation	Manuel contributeur CMS + doc technique Run + ADR
PBS-8	Audit & conformité	Rapports RGAA AA, OWASP ASVS 2, performance Lighthouse

4.2 WBS — Work Breakdown Structure

Le WBS détaillé (tabulaire + graphique) est dans le document compagnon **P2-06 — WBS**. Il décompose le projet en **8 lots** et **34 work packages**. La représentation graphique est produite par PlantUML.

4.3 Macro-planning et planning détaillé

Le diagramme de Gantt baseline (vues macro et détaillée par sprint Scrum) est dans le document compagnon **P2-07 — Planning Gantt**. Cadence sprint : 2 semaines. Total : 11 sprints S1-S11.

4.4 Jalons majeurs

N°	Jalon	Critère de passage	Date
J0	Démarrage officiel	Charte signée + équipe staffée + kick-off réalisé	22/04/2026
J1	Maquettes UX validées	Design system v1 + 5 parcours-clés signés métier	27/05/2026
J2	Socle technique validé	Architecture validée + API v1 documentée + CI/CD opérationnel	30/06/2026
J3	MVP fonctionnel	Site + CMS + espace client min. en staging — démo MOA OK	31/07/2026
J4	Recette + RGAA	PV de recette signé + audit RGAA AA réussi	31/08/2026
J5	Go-Live + Clôture	Bascule production + transfert run + REX rédigé	30/09/2026

4.5 Liste des livrables et critères d'acceptation

Livrable	Critère d'acceptation	Échéance
Charte projet (P1-01)	Signée par CP / DSI / DG	J0
PMP (ce document)	Validé en COPIL d'avril	22/04
Wireframes + design system v1	5 parcours principaux + 30 composants Storybook	J1
API REST v1	12 endpoints, doc OpenAPI 3, tests > 80 %	J2
Pipeline CI/CD	Déploiement auto staging on push, prod on tag	J2
Site corporate	10 templates de page, contenu validé Marketing	J3
CMS contributeur	3 rôles, multi-utilisateurs, doc utilisateur livrée	J3
Espace client	Login SSO/local + profil + historique commandes	J3
Audit RGAA 4.1	Score $\geq$ niveau AA, rapport éditeur certifié	J4
Audit OWASP ASVS 2	Aucune vulnérabilité critique ouverte	J4
Tests performance	Lighthouse Perf $\geq$ 90, A11y $\geq$ 90 sur 10 parcours	J4
Bascule production (Go-Live)	SLO uptime $\geq$ 99,5 %, monitoring en place	J5
PV de transfert run	Signé DSI Ops + équipe Run formée	J5
Fiche REX	Sessions REX tenues, capitalisations classées PMO	J5

5 — Gestion des ressources et budget

5.1 Dimensionnement RH

Effectif total cumulé : **4,5 ETP internes + 400 j/h ESN Sopra Steria** sur 6 mois (équivalent ≈ 4 ETP ESN).
Tableau RH détaillé : voir §3.2.

5.2 Ressources matérielles

- **Environnements cloud** : Azure West Europe — 3 environnements (dev, staging, prod) — estimé 1 K€/mois.
- **Licences logicielles** : CMS headless (Strapi Cloud ou Directus Pro) — 6 K€/an ; Figma équipe (10 sièges) — 1,5 K€/an ; outils de monitoring (Application Insights, Sentry) — inclus Azure.
- **Outillage** : repo GitHub Enterprise (existant), Jira (existant), Confluence (existant).
- **Postes de travail** : équipe interne équipée ; ESN apporte son matériel.

5.3 Budget prévisionnel synthétique

Le détail par poste mensuel est dans le document compagnon **P2-08 — Budget prévisionnel**. Synthèse :

Poste	Montant	% total	Nature
ESN Sopra Steria (forfait 400 j/h)	200 K€	67 %	Externe
Interne DSI (valorisation j/h)	80 K€	27 %	Interne
Licences (CMS, Figma, monitoring)	7 K€	2 %	Externe
Infrastructure Azure	6 K€	2 %	Externe
Audits externes (RGAA, OWASP)	4 K€	1 %	Externe
Réserve aléas (intégrée par poste)	3 K€	1 %	Réserve
TOTAL	300 K€	100 %	

6 — Plan de communication

6.1 Contenus et cibles

Cible	Contenu	Objectif
DG / sponsor	Synthèse RAG + écarts + arbitrages	Décider, sponsoriser
COPIL	Tableau de bord + jalons + risques	Arbitrer
Équipe projet	Sprint backlog, démos, rétro	Aligner, livrer
ESN Sopra Steria	Backlog forfait, livrables, paiements	Piloter
Métiers (Marketing, Commerce)	Démos, contenus à valider	Co-construire
DSI Ops / Run	Documentation transfert, formation	Prendre la main au Go-Live
Collaborateurs internes	Annonces Go-Live, formation CMS	Adopter, contribuer
Clients / prospects	Annonce Go-Live (newsletter, presse)	Engager, convertir

6.2 Moyens et outils


- **Teams** : canaux dédiés (équipe, ESN, métiers).
- **SharePoint Online** : référentiel documentaire PMO + dossier projet.
- **Jira** : backlog Scrum, suivi anomalies.
- **Confluence** : documentation technique, ADR.
- **Cockpit DSI** : tableau de bord temps réel, RAG, KPIs.
- **COPIL** en présentiel + Teams pour les distants.
- **Newsletter interne** : Time'Eats Hebdo (relais des annonces Go-Live).

6.3 Fréquence et formats

Voir document compagnon **P2-10 — Plan de communication** pour le détail fréquence × canal × destinataire.

7 — Gestion des risques

7.1 Cartographie des risques (probabilité × impact)

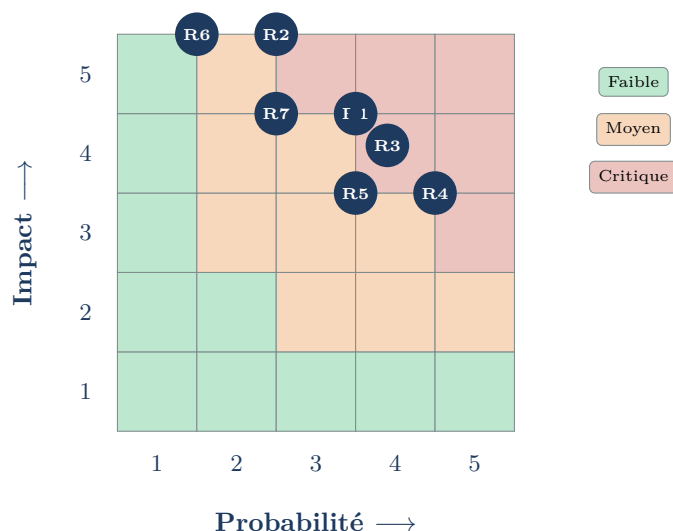

7.2 Registre des risques (top 7)

ID	Risque	P	I	Score	Mitigation
R1	Retard projet Office 365 (SSO espace client)	3	4	12 Ambre	Plan B : IdP local Keycloak (surcoût 8 K€). Décision GO/NO-GO IdP à J2.
R2	Non-conformité RGAA 4.1 niveau AA	2	5	10 Ambre	Audit blanc S20 + plan d'action. Audit final S23 par cabinet certifié.
R3	Sous-effectif ESN sur sprint critique S22-24	3	4	12 Ambre	Clause contractuelle de continuité d'équipe + pénalités.
R4	Dérive de scope sur CMS (contenu legacy)	4	3	12 Ambre	Gouvernance changement stricte (§9) + COPIL d'arbitrage.
R5	Indisponibilité référent Marketing (validation)	3	3	9 Ambre	15 % temps contractualisé + créneaux fixes (mardis 14-17h).
R6	Cyberattaque (XSS, injection, DDoS)	1	5	5 Vert	Audit OWASP ASVS 2 obligatoire pré Go-Live + WAF Azure activé.
R7	Performance dégradée (LCP > 2,5 s)	2	4	8 Ambre	Budget perf en sprint + tests Lighthouse en CI.

7.3 Actions de mitigation

Voir le document compagnon **P2-09 — Registre des risques** pour les fiches détaillées par risque (déclencheurs, plans de contournement, propriétaires, échéances de revue).

8 — Gestion de la qualité

8.1 Normes et standards applicables

Référentiel	Exigence appliquée
RGPD	Registre des traitements, consentements granulaires, droits d'accès/suppression, DPO informé.
RGAA 4.1	Niveau AA sur l'ensemble du périmètre fonctionnel, audit par cabinet certifié avant Go-Live.
OWASP ASVS	Niveau 2 sur l'API et l'espace client (vérification automatisée + audit manuel).
Web Vitals (Google)	LCP < 2,5 s, INP < 200 ms, CLS < 0,1 sur 75 % des visites mobiles.
ISO 27001	Cohérence avec la PSSI Time'Eats (hébergement Azure FR, durcissement).
SEO sémantique	Schema.org (Organization, Product, Article), sitemap, robots, balisage Open Graph.

8.2 Plan de contrôle qualité

Qui	Quoi	Quand	Comment
Devs (interne + ESN)	Tests unitaires	À chaque PR	Jest + couverture $\geq 80\%$ (bloquante en CI)
ESN QA automation	Tests d'intégration / E2E	Sprint	Playwright (10 parcours critiques)
Tech Lead	Code review	À chaque PR	1 reviewer min., règles ESLint / SonarQube
DevOps	Tests perf (Lighthouse)	Pipeline CI	Score Perf ≥ 90 , A11y ≥ 90 (bloquant)
MOA Marketing	Recette fonctionnelle	J3 et J4	Scénarios métier sur staging, log dans P3-15
Cabinet RGAA	Audit accessibilité	S22 (blanc) + S26	Rapport éditeur certifié, plan d'action
RSSI / cabinet sécu	Audit OWASP ASVS 2	S26-27	Pentest + revue manuelle
DPO	Revue RGPD	J3 et J5	Registre traitements + bandeau consentement
PMO	Audit qualité documentaire	Mensuel	Conformité aux templates, traçabilité COPIL

8.3 Procédures de validation

Tout livrable est soumis à **trois passes** : (1) auto-revue par l'auteur, (2) revue par le pair (Tech Lead ou QA selon nature), (3) validation MOA ou sponsor selon livrable. Les défauts détectés en recette sont consignés dans le **Log des anomalies** (P3-15) et classés (P1 bloquant / P2 majeur / P3 mineur). Critère de Go-Live : zéro P1 ouvert, ≤ 3 P2 acceptés avec plan de résolution.

9 — Gestion des changements

9.1 Processus de gestion des modifications de périmètre



- Réception** : toute demande de modification de scope est formalisée via le template **P3-14 — Demande de changement**, soumise par le demandeur au CP via Jira.
- Analyse d'impact** : le CP, en lien avec le Tech Lead et le Lead ESN, évalue les conséquences sur le **Triangle d'Or** (Coût / Délai / Qualité). Délai max : 5 jours ouvrés.
- Décision** : la demande est arbitrée en COPIL (mensuel) ou en COPIL extraordinaire si urgence. Décisions possibles : approuvée / approuvée avec amendement / refusée / différée Phase 2.
- Mise à jour** des baselines : si approuvée, le PMP, WBS, Gantt, budget, registre des risques sont mis à jour. Nouvelle baseline figée.
- Communication** : la décision est tracée en CR de COPIL (P4-18) et communiquée à toutes les parties prenantes concernées.

9.2 Accompagnement humain — méthode ADKAR

Le projet impacte directement les contributeurs Marketing (nouveau CMS), Commerce (nouvelle API), Service Client (espace client). Plan de conduite du changement détaillé : **P2-11 — Plan de conduite du changement**. Synthèse ADKAR :

Étape	Objectif	Dispositifs Refonte Web
A	Awareness (Sensibilisation)	Kick-off plénier interne (J0), newsletter Time'Eats Hebdo, brève DG.
D	Desire (Adhésion)	Ateliers de co-construction maquettes (Marketing, Commerce) à S5-S8.
K	Knowledge (Connaissance)	Formations CMS Key Users (2 sessions de 4h en S22-23), tutos vidéo.
A	Ability (Capacité)	Hotline contributeurs 2 semaines post Go-Live, FAQ Confluence, coaching.
R	Reinforcement (Ancrage)	Mesure adoption (nb publications/contributeur, NPS interne) à M+1 et M+3.

10 — Suivi, contrôle et clôture

10.1 KPI et indicateurs de suivi

Axe	Indicateur	Calcul / Source	Cible	Seuil alerte
Coûts	Budget consommé / prévu	Comptabilité analytique	$\leq 100\%$	$> 105\%$
	IPC (Valeur acquise EVM)	VA / CR	$\geq 0,95$	$< 0,90$
Délais	Jalons respectés / planifiés	Planning Gantt	100 %	$< 80\%$
	IPD (Valeur acquise EVM)	VA / VP	$\geq 0,90$	$< 0,80$
Qualité	Couverture tests automatisés	CI (Jest)	$\geq 80\%$	$< 70\%$
	Score Lighthouse Perf	Pipeline	≥ 90	< 80
	Score Lighthouse A11y	Pipeline	≥ 90	< 80
	Anomalies P1 ouvertes	Jira	0	> 0
Run cible	Disponibilité SLO	Application Insights	$\geq 99,5\%$	$< 99\%$
	Taux d'erreur applicatif	Application Insights	$< 1\%$	$> 2\%$
Humain	Satisfaction équipe (post-sprint)	Forms anonyme	$\geq 4,0/5$	$< 3,5$
	Satisfaction sponsor	Questionnaire	$\geq 80/100$	$< 60/100$

10.2 Tableau de bord et reporting

Les KPIs sont remontés en temps réel dans le **Cockpit DSI** (onglet Refonte Web). Le **tableau de bord projet P4-16** est produit mensuellement pour archivage et COPIL. Le **Rapport d'écarts P4-17** est émis dès franchissement d'un seuil d'alerte. Cadence reporting :

- **Quotidien** (équipe) : daily Scrum + Jira.
- **Hebdomadaire** (PMO) : RAG + jalons mis à jour dans le Cockpit DSI.
- **Mensuel** (COPIL) : tableau de bord P4-16 + démos sprints du mois.
- **À l'événement** : rapport d'écarts P4-17 + CR COPIL P4-18.

10.3 Clôture et critères de succès

Critères de succès Go-Live (J5) :

- Zéro anomalie P1 ouverte, ≤ 3 anomalies P2 avec plan de résolution.
- RGAA AA et OWASP ASVS 2 audités et conformes.
- Lighthouse Perf ≥ 90 et A11y ≥ 90 sur 10 parcours-clés.
- PV de recette fonctionnelle (P5-19) signé par MOA Marketing.
- PV de recette technique (P5-20) signé par RSSI et Tech Lead.
- PV de transfert exploitation (P5-22) signé par DSI Ops.

Cérémonie de clôture : COPIL de clôture, communication interne, capitalisation PMO.

10.4 REX — Retour d'expérience

La séance REX (P5-23) est animée par le CP en M+1 post Go-Live. Format : 2h en présentiel, 3 tours (ce qui a fonctionné / ce qui n'a pas fonctionné / propositions d'amélioration). Participants : équipe projet complète + référents métier. Capitalisations classées sur SharePoint PMO, intégrées au prochain cycle de mise à jour du référentiel.

11 — Annexes

11.1 Glossaire et acronymes

Acronyme / Terme	Définition
ADKAR	Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement (méthode de conduite du changement).
APM	Application Performance Monitoring.
ASVS	Application Security Verification Standard (OWASP).
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Delivery.
COPIL	Comité de Pilotage.
EVM	Earned Value Management (Valeur Acquise).
IdP	Identity Provider.
IPC / IPD	Indice Performance Coût / Délai.
LCP / INP / CLS	Largest Contentful Paint / Interaction to Next Paint / Cumulative Layout Shift.
MOA / MOE	Maîtrise d'Ouvrage / Maîtrise d'œuvre.
PBS / WBS	Product / Work Breakdown Structure.
PDCA	Plan-Do-Check-Act (roue de Deming).
PMO	Project Management Office.
PMP	Plan de Management Projet.
RACI	Responsible, Accountable, Consulted, Informed.
RAG	Red / Amber / Green (statut de pilotage).
RGAA	Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité.
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données.
REX	Retour d'EXpérience.
SMART	Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel.
SLO	Service Level Objective.
SSO	Single Sign-On.
TCO	Total Cost of Ownership.

11.2 Documents de référence (corpus PMO Time'Eats)

Ce PMP s'inscrit dans le **référentiel documentaire commun** défini au chapitre 3 du livrable principal ([livrable_complet.pdf](#)). Les documents compagnons instanciés pour ce projet sont :

ID	Document	Chemin
P1-01	Charte projet	projets/refonte_web/P1-01_charte_projet.tex
P1-02	Note de cadrage	projets/refonte_web/P1-02_note_de_cadrage.tex
P1-03	Fiche d'identification	projets/refonte_web/P1-03_fiche_identification.tex
P1-04	Matrice RACI	projets/refonte_web/P1-04_matrice_raci.tex
P2-05	Plan de Management Projet	projets/refonte_web/P2-05_plan_management_projet.tex (ce document)
P2-06	WBS (+ graphique)	projets/refonte_web/P2-06_wbs.tex
P2-07	Planning Gantt	projets/refonte_web/P2-07_planning_gantt.tex
P2-08	Budget prévisionnel	projets/refonte_web/P2-08_budget_previsionnel.tex
P2-09	Registre des risques	projets/refonte_web/P2-09_registre_risques.tex
P2-10	Plan de communication	projets/refonte_web/P2-10_plan_communication.tex
P2-11	Plan conduite du changement	projets/refonte_web/P2-11_plan_conduite_changement.tex
P3-12	CR réunion (exemple Kick-off)	projets/refonte_web/P3-12_cr_reunion.tex
P3-13	Rapport d'avancement (M+1)	projets/refonte_web/P3-13_rapport_avancement.tex

Templates vierges du corpus (Phases 3 à 5 non encore instanciées) : disponibles dans `referentiel/` et à instancier au fur et à mesure de l'avancement (CR de réunion, rapport d'avancement, demande de changement, log anomalies, tableau de bord, rapport d'écarts, CR COPIL, PV de recette, rapport de clôture, PV de transfert, fiche REX).

11.3 Conseil méthodologique — Démarche PDCA / 3P

Pour maximiser la réussite du projet, l'équipe applique la **Roue de Deming (PDCA)** sur chaque cycle de sprint et chaque jalon majeur :

Étape	Action	Application Refonte Web
P	Plan	Sprint planning : sélection backlog, estimation, definition of done.
D	Do	Sprint execution : daily Scrum, pair programming, revue continue.
C	Check	Démo sprint + rétrospective : mesure des engagements, IPC/IPD, satisfaction équipe.
A	Act	Actions correctives (refactorisation, ajustement vélocité), capitalisation REX.

✓ Recommandation

La boucle PDCA est appliquée à **trois échelles** : sprint (toutes les 2 semaines), jalon (J1 à J5), et projet (REX final). C'est la garantie d'une amélioration continue alignée avec la politique qualité du PMO Time'Eats.
