


Planning Gantt

Phase 2 — Planification | Projet : **Refonte Web**

Champ	Valeur	Champ	Valeur
Date de début	22/04/2026	Date de fin	30/09/2026
Version	1.0 baseline	Dernière MAJ	19/05/2026
Durée totale	23 semaines (S17–S40 2026)	Sem. de référence (today)	S21 (semaine du 18/05/2026)

❖ Constat clé

Baseline validée en COPIL d'inception le **20/05/2026**. Le **today rule** pointé S21 reflète l'état au **19/05/2026**. Le planning détaillé hebdomadaire est tenu dans *Azure DevOps Boards* (lien SharePoint).

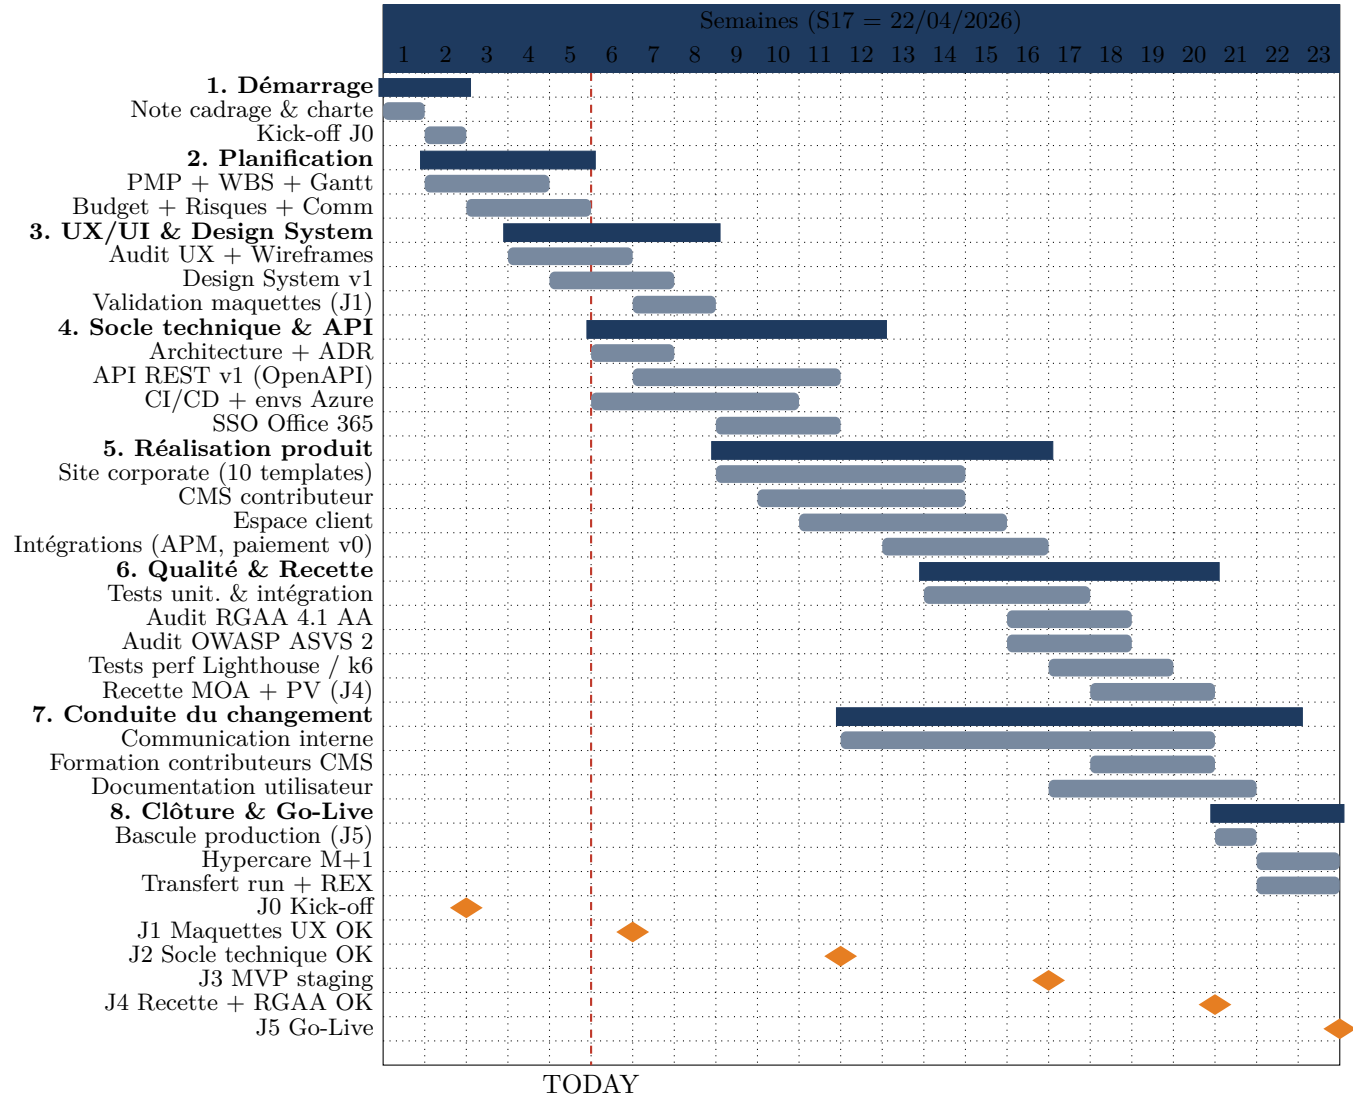

Synthèse des jalons — baseline

N°	Jalon	Date baseline	Condition de franchissement
J0	Kick-off projet	22/04/2026	Charte signée + équipe staffée
J1	Maquettes UX validées	27/05/2026	Design system v1 + parcours-clés signés MOA
J2	Socle technique validé	30/06/2026	API v1 testée + CI/CD opérationnelle + envs prêts
J3	MVP fonctionnel en staging	31/07/2026	Site + CMS + espace client en démo MOA
J4	Recette + audits OK	31/08/2026	PV recette signé + RGAA AA + OWASP ASVS 2
J5	Go-Live production	30/09/2026	Bascule réussie + monitoring run + REX

▲ Point d'alerte

Chemin critique : Validation maquettes (J1, S21) → Architecture API (S22) → API REST v1 (S23–S27) → Réalisation produit (S25–S32) → Recette MOA (J4, S36) → Go-Live (J5, S40). Toute dérive sur ce chemin déclenche un rapport d'écarts immédiat (cf. P2-08 §3 EVM).
