

Time'Eats

Cellule PMO — Direction des Systèmes d'Information

Supervision du portefeuille de projets IT & Pilotage du projet Refonte Web

Professionnalisation de la cellule PMO

Projet Collaboratif — CESI MAALSI — Semestre 2

Mai 2026

Portefeuille : 11 projets — 1 700 K€ — DSI : 21 personnes | Projet Refonte Web : 300 K€ — 6 mois

Table des matières

Introduction	3
I Gestion du portefeuille	4
1 Enjeux et gouvernance du portefeuille	5
1.1 Contexte Time'Eats	5
1.2 Enjeux du portefeuille	5
1.3 Objectifs généraux du portefeuille	5
1.4 Modèle de priorisation des projets	6
1.5 Vue synthétique du portefeuille	8
2 Méthodologie projet partagée	9
2.1 Cycle de vie commun	9
2.2 Pilier 1 — Gouvernance par les rituels	9
2.3 Pilier 2 — Exécution bimodale (le bon outil pour le bon projet)	10
2.4 Pilier 3 — Pilotage capacitaire et gestion des ESN	11
2.5 Pilier 4 — Standardisation du suivi et contrôle	11
2.6 Mesure de l'impact de la méthodologie	12
3 Référentiel documentaire commun	14
3.1 Principe du référentiel	14
3.2 Catalogue des 26 templates — chemins et fréquence	14
3.3 Référentiel d'indicateurs en cascade — projet ⇒ PMO	17
4 Tableau de bord de supervision — Cockpit DSI	21
4.1 Architecture technique	21
4.2 API REST — Endpoints de supervision	22
4.3 Les 5 onglets du Cockpit	22
4.4 Capitalisation et amélioration continue	24
II Application au projet Refonte Web	26
5 Cadrage du projet Refonte Web	27
5.1 Carte d'identité du projet	27
5.2 Enjeux et objectifs SMART	28
5.3 Périmètre et options	28
5.4 Approche hybride retenue	28
6 Pilotage opérationnel du projet Refonte Web	29
6.1 Jalons baseline	29
6.2 WBS — vue tabulaire synthétique	29

6.3	WBS — vue graphique	30
6.4	Budget — synthèse	31
6.5	Risques majeurs (top 7)	31
6.6	Tableau de bord projet (cockpit) — état au 19/05/2026	32
7	Dossier PMP Refonte Web — documents instanciés	33
7.1	Architecture du dossier compagnon	33
7.2	Index des 15 documents instanciés	33
7.3	Documents à produire au fil de l'avancement	34

Introduction

Pourquoi ce document ? Time'Eats, spécialiste de la vente et livraison de repas préparés (siège à Rennes), engage en 2026 un programme de transformation digitale. Sa DSI (**21 personnes, 11 projets** simultanés, **1 700 K€** de budget annuel, fort recours aux ESN) opère aujourd'hui sans cadre méthodologique partagé : chaque chef de projet (CP) applique ses propres pratiques, ses propres modèles de documents et ses propres indicateurs. La conséquence directe est **l'impossibilité de consolider le portefeuille** : la direction ne dispose ni d'une vision unifiée des avancements, ni d'un suivi budgétaire cohérent, ni d'une lecture des risques transverses.

Ce document est le référentiel de gestion de projet que la **cellule PMO** publie pour répondre à ce manque. Il n'est pas un livrable académique : il est le *document de référence interne* que tout CP de la DSI Time'Eats doit appliquer pour cadrer, exécuter, piloter et clôturer un projet.

❖ Constat clé

Place de la cellule PMO dans l'organisation. La cellule PMO est **transverse** à la DSI. Elle est **garante de la méthodologie**, du référentiel documentaire et du reporting consolidé. Elle **ne pilote pas les projets** (cette responsabilité reste au CP) : elle **outille les CP** (templates, indicateurs, cockpit) et **consolide pour la direction** (vue portefeuille, météo des projets, agrégats budgétaires).

Destinataires du document :

- **Primaire** — les chefs de projet de la DSI (5 CP) : ils appliquent la méthodologie,instancient les templates et alimentent les indicateurs projet.
- **Secondaire** — la DSI et la direction générale : elles consomment la vue portefeuille consolidée par le PMO.
- **Tertiaire** — les ESN partenaires (Sopra Steria, Capgemini, etc.) : elles s'alignent sur les standards documentaires et les jalons de pilotage exigés par le PMO.

Trois objectifs structurent ce référentiel :

1. **Professionnaliser la gestion de projet** via une méthodologie hybride explicite (PMBOK 7^e édition + Scrum), organisée en 4 piliers (gouvernance, exécution bimodale, capacitaire & ESN, standardisation du suivi) — Ch. 2.
2. **Uniformiser les documents** internes et externes via un **référentiel de 26 templates LaTeX versionnés**, couvrant les 5 phases PMBOK et applicables à tous les projets du portefeuille — Ch. 3.
3. **Alimenter une plateforme live de KPI** : chaque indicateur projet remonte automatiquement vers le **Cockpit DSI**, consultable en temps réel par les CP (vue micro) et la direction (vue macro) — Ch. 3 et 4.

Ce livrable est structuré en deux parties complémentaires :

- **Partie I — Gestion du portefeuille** (Ch. 1–4). Présente la *méthodologie partagée par tous les projets* : enjeux et gouvernance du portefeuille, méthodologie hybride à 4 piliers, référentiel documentaire commun (26 templates LaTeX avec chemins), référentiel d'indicateurs en cascade, et tableau de bord de supervision (Cockpit DSI).
- **Partie II — Application au projet Refonte Web** (Ch. 5–7). Démontre l'*instanciation concrète* de la méthodologie sur un projet du portefeuille (Refonte Web — 300 K€ — ESN Sopra Steria — Go-Live 30/09/2026). Renvoie au **dossier compagnon PMP Refonte Web** qui rassemble les documents instanciés à partir des templates du référentiel.

✓ Recommandation

Les tableaux de bord de supervision (Ch. 4) ont été **implémentés sous forme d'application web interactive** : le **Cockpit DSI Time'Eats**, développé en Node.js/Express. Ce cockpit constitue la *source de vérité unique* du PMO conformément au Pilier 4 (§2.4). L'application est accessible en interne sur <http://localhost:3001>.

Première partie

Gestion du portefeuille

Enjeux et gouvernance du portefeuille

1.1 Contexte Time'Eats

Time'Eats se trouve à un **tournant stratégique majeur** : l'entreprise doit simultanément consolider son socle technique, accélérer sa croissance nationale et professionnaliser sa DSI — le tout avec **21 personnes** et un budget de **1 700 K€**. Le portefeuille de 11 projets n'est pas un catalogue de chantiers : c'est le **programme de transformation de l'entreprise pour les 12 prochains mois**. Sans cadre PMO structuré, ce volume de projets simultanés conduit inévitablement à des dérives budgétaires, des conflits de ressources et une perte de valeur livrée.

1.2 Enjeux du portefeuille

Dimension	Enjeu identifié	Conséquence si non adressé
Stratégique	Aligner les 11 projets IT sur les priorités business de Time'Eats (croissance nationale, relation client, compétitivité)	Investissement IT déconnecté du terrain — ROI non perçu par la direction
Financier	Maîtriser un budget global de 1 700 K€ réparti sur des prestataires multiples, des modes contractuels variés et 12 mois d'exécution	Dépassements en cascade — arbitrages budgétaires brutaux en cours d'année
Capacitaire	Absorber 11 projets Build simultanés sans dégrader le Run (MCO), avec une DSI de 21 personnes dont 5 chefs de projet	Épuisement des équipes, glissement des délais, qualité sacrifiée
Opérationnel	Gérer les dépendances inter-projets (Office 365 bloquant 3 projets majeurs) et les risques de propagation des retards	Effet domino sur CRM, Refonte Web et Apps mobiles
Humain	Piloter les ESN (contrats, livrables, satisfaction) tout en développant les compétences internes	Dépendance excessive aux prestataires, perte de souveraineté technique
Gouvernance	Professionnaliser la cellule PMO pour produire une vision consolidée fiable en temps réel	Décisions prises sur des données obsolètes ou incomplètes

1.3 Objectifs généraux du portefeuille

Ces objectifs sont **mesurables et suivis** via le Cockpit DSI (Ch. 4). Ils constituent le cadre de succès du portefeuille que le PMO présente au Comité Stratégique mensuel.

#	Objectif	Indicateur associé	Cible	Horizon
O1	Livrer 100 % des projets critiques (score $\geq 3,50$) dans le périmètre validé	Taux de respect du périmètre	100 %	Déc. N
O2	Maîtriser le budget total du portefeuille à $\pm 5 \%$ du prévisionnel	Taux de dépassement budgétaire	$\leq 5 \%$	Déc. N
O3	Respecter les jalons critiques du portefeuille (démarrage, go-live)	% jalons respectés	$\geq 80 \%$	Continu
O4	Garantir la continuité de service (Run) pendant la phase Build	Uptime moyen des 9 serveurs	$\geq 99 \%$	Mensuel
O5	Résoudre les incidents P1 en moins de 5 jours ouvrés	Délai moyen résolution P1	$\leq 5 j$	Continu
O6	Professionnaliser le PMO via un référentiel documentaire appliqué sur 100 % des projets	Taux de réutilisation des templates	$\geq 60 \%$	Juin N
O7	Identifier en amont les risques majeurs (avant impact)	% risques identifiés avant occurrence	$\geq 70 \%$	Continu

▲ Point d'alerte

Hiérarchisation des objectifs : O4 (continuité de service) et O5 (incidents P1) sont non négociables — un incident P1 non résolu sous 5 jours impacte directement les revenus de Time'Eats (plateforme de livraison). Les objectifs O1 à O3 sont le cœur de la mission PMO.

1.4 Modèle de priorisation des projets

❖ Constat clé

Origine et révisabilité de la pondération. Les poids ci-dessous (35 / 25 / 20 / 10 / 10) constituent une **estimation initiale** calibrée par la cellule PMO en avril 2026, sur la base de trois apports : (i) l'*atelier de cadrage des 5 CP* du 15/04/2026 (consensus sur la hiérarchie des critères) ; (ii) le *cadrage du DSI* (priorité : stratégie > rentabilité > maîtrise des risques) ; (iii) la pratique de référence *PMI Portfolio Management Standard*. **La formule n'est pas figée** : elle est révisée annuellement en Comité Stratégique (T1) au regard du REX de l'année précédente. Les leviers d'évolution attendus sont : durcissement du contexte réglementaire (poids *Urgence réglementaire*), maturité capacitaire de la DSI (poids *Dépendances*), exigences ROI renforcées de la direction (poids *Rentabilité*).

Critère	Poids	Cotation (1 à 5)
Nécessité / Importance stratégique	35 %	Issu du cahier des charges (1 = faible, 5 = critique)
Rentabilité attendue	25 %	Issu du cahier des charges (1 = faible ROI, 5 = ROI élevé)
Niveau de maîtrise des risques	20 %	Issu du cahier des charges (1 = très risqué, 5 = maîtrisé)
Dépendances critiques	10 %	Nombre de projets bloqués : 0 → 1pt, 1 → 2pts, 2 → 3pts, 3 → 4pts, 4+ → 5pts
Urgence réglementaire	10 %	5 si projet réglementaire, 1 sinon
Score de priorité	$\sum (\text{critère} \times \text{poids})$ — de 1,00 à 5,00	

Seuils RAG : **Vert** $\geq 3,50$ (priorité haute) **Ambre** 2,75–3,49 (priorité moyenne) **Rouge** $< 2,75$ (priorité basse)

Tableau de priorisation des 11 projets

Projet	Imp.	Rent.	Risq.	Dép.	Règl.	Score	Statut
Refonte Web	5	5	2	4	1	3,80	Vert
CRM	5	3	4	4	1	3,70	Vert
App Mobile Clients	5	5	3	1	1	3,70	Vert
MFA	5	3	4	3	1	3,60	Vert
Sauvegarde Cloud	5	3	5	1	1	3,60	Vert
App Mobile Fourn.	5	5	2	1	1	3,50	Vert
MAJ Outils Paie	5	1	4	1	5	3,40	Ambre
Office 365	4	2	3	5	1	3,00	Ambre
CI/CD	3	3	3	5	1	2,90	Ambre
Stockage & Fichiers	4	3	3	1	1	2,85	Ambre
Migration Azure	3	4	1	3	1	2,55	Rouge

Imp.=Importance, Rent.=Rentabilité, Risq.=Maîtrise risques, Dép.=Dépendances critiques, Règl.=Urgence réglementaire

▲ Point d'alerte

Office 365 est classé Ambre malgré son importance de 4/5 : sa rentabilité directe (2/5) est faible. Mais son score « Dépendances » (5/5) révèle qu'il bloque 3 projets Vert. Le PMO doit lui allouer une priorité de planning absolue, indépendamment de son score de priorité.

Migration Azure est classée Rouge (maîtrise des risques : 1/5) : migration de 4 serveurs métiers sur des technologies vieillissantes. Un accompagnement par une ESN spécialisée Azure est impératif.

1.5 Vue synthétique du portefeuille

Projet	Début	Durée	Budget	Mode	Statut
Office 365	Avr N	3 mois	100 K€	Waterfall	Ambre
Refonte Web	Avr N	6 mois	300 K€	Hybride	Vert
CI/CD	Avr N	3 mois	100 K€	Waterfall	Ambre
App Mobile Clients	Mai N	8 mois	150 K€	Agile	Vert
App Mobile Fourn.	Mai N	8 mois	200 K€	Agile	Vert
CRM	Juin N	6 mois	250 K€	Agile	Vert
MFA	Juil N	4 mois	150 K€	Waterfall	Vert
Migration Azure	Août N	5 mois	200 K€	Waterfall	Rouge
MAJ Outils Paie	Sept N	3 mois	50 K€	Waterfall	Ambre
Stockage & Fichiers	Oct N	3 mois	100 K€	Waterfall	Ambre
Sauvegarde Cloud	Oct N	4 mois	100 K€	Waterfall	Vert
TOTAL			1 700 K€		

✓ Recommandation

Le projet **Refonte Web** (mis en évidence) sera utilisé en **Partie II** pour démontrer l'instanciation complète de la méthodologie PMO sur un projet du portefeuille.

Méthodologie projet partagée

> Choix retenu

Adopter une **méthodologie PMO Hybride à 4 piliers**, axée sur le pragmatisme et la gestion stricte de la capacité. Elle distingue les projets par nature et impose un rythme de gouvernance commun à l'ensemble du portefeuille.

2.1 Cycle de vie commun

Tous les projets du portefeuille suivent un cycle de vie en **5 phases** (PMBOK 7^e éd.) :

Phase	Nom	Sortants attendus
1	Démarrage	Note de cadrage, charte projet signée, fiche d'identification, matrice RACI
2	Planification	PMP, WBS, Planning Gantt, Budget prévisionnel, Registre risques, Plan communication, Plan conduite du changement
3	Exécution	CR de réunion (hebdo/sprint), rapports d'avancement mensuels, demandes de changement, logs anomalies
4	Maîtrise	Tableau de bord projet, rapport d'écarts, COPIL mensuel, slides COPIL
5	Clôture	PV de recette (fonctionnelle, technique), PV de transfert exploitation, lettre fin mission ESN, bilan RGPD, fiche REX

2.2 Pilier 1 — Gouvernance par les rituels

Le PMO doit dicter le **rythme de pilotage** pour éviter la dispersion des ressources internes sur 11 fronts simultanés.

Rituel	Fréquence	Participants	Objectif
Comité Stratégique	Mensuel	DG + DSI	Validation budgétaire (dépassements), escalades risques majeurs, réévaluation de la priorisation
Revue Portefeuille PMO	Hebdomadaire	DSI + 5 CPs	Météo des projets (RAG), jalons critiques, disponibilité des ressources, suivi des dépendances
Stand-up DSI	Quotidien (15 min)	Équipes techniques	Lever les blocages opérationnels entre le Run (MCO) et le Build (11 projets)

▲ Point d'alerte

Le projet **Office 365** doit faire l'objet d'un point dédié en revue hebdomadaire : tout retard sur ce prérequis se propage immédiatement sur le CRM, la Refonte Web et les applications mobiles.

2.3 Pilier 2 — Exécution bimodale (le bon outil pour le bon projet)

Les projets sont scindés en deux modes d'exécution selon leur nature :

Mode	Projets concernés	Caractéristiques
Cycle en V / Waterfall	Migration Azure, Sauvegarde Cloud, MAJ Outils de Paie, MFA, Office 365, CI/CD, Stockage Fichiers	Périmètre et contraintes techniques/légales fixes. Planification rigoureuse, gestion des risques techniques en amont, livraison unique validée par PV de recette.
Agile / Scrum	App Mobile Clients, App Mobile Fournisseurs, CRM	Le périmètre peut évoluer selon les retours utilisateurs. Sprints de 2 à 3 semaines, revue de sprint et rétrospective systématiques, livraison de valeur incrémentale.
Hybride	Refonte Web	Cadrage / clôture en Waterfall (PMP, baselines, recette, transfert) ; Exécution en Scrum (UX, dev, CMS). Combine la rigueur contractuelle et l'agilité produit.

✓ Recommandation

Pour les projets Agile ou Hybride, constituer une **équipe dédiée par produit** (CP + Tech Lead + ESN) afin d'éviter le multi-projet qui dégrade la vitesse. La plateforme CI/CD (projet Avril N) renforcera la livraison continue dès le T3.

2.4 Pilier 3 — Pilotage capacitaire et gestion des ESN

C'est le nerf de la guerre : avec des équipes internes limitées, la gestion des prestataires dictera la réussite ou l'échec du portefeuille.

Levier	Description et justification
Sanctuarisation du Run	Avant tout planning projet, définir le % de temps alloué au MCO (ex. 30 % des admins systèmes). Le reste constitue la capacité réelle disponible pour les projets.
Stratégie Faire / Faire Faire	Projets socles à forte connaissance interne (MFA, Stockage) : maximum d'internalisation. Projets à fort volume de développement (Apps mobiles, CRM, Refonte Web) : externalisation vers ESN spécialisées.
Contrats au Forfait (ESN)	Privilégier les contrats forfaitaires plutôt qu'en régie (temps passé). Sécurise le budget global de 1 700 K€ et transfère le risque de dépassement à l'ESN. Ex. Sopra Steria sur Refonte Web : 200 K€ forfait 400 j/h.
Pilotage par les livrables	Engagement de résultats contractuels : jalons intermédiaires avec critères d'acceptation mesurables, déclencheurs de paiement liés aux livrables validés.

2.5 Pilier 4 — Standardisation du suivi et contrôle

Pour que le PMO consolide les données sans passer ses journées à faire du reporting, des **standards intransigeants** s'imposent.

Standard	Contenu
Source de vérité unique	Tous les projets utilisent le même outil de suivi (Cockpit DSI) et le même référentiel documentaire (Charte, PMP, PV de recette). Aucune donnée de projet hors de ces outils.
Suivi des dépendances (chemin critique)	Imposer un suivi visuel (Gantt du portefeuille) des bloqueurs inter-projets. Si Office 365 prend du retard, l'impact en cascade sur CRM, Web et Apps mobiles est immédiatement visible.
Format RAG unifié	Chaque chef de projet livre une fiche mensuelle avec statut Rouge/Ambre/Vert sur trois axes : Coûts, Délais, Qualité. Lecture immédiate en revue portefeuille.
Seuil d'escalade automatique	Tout projet passant en Rouge sur deux mois consécutifs déclenche automatiquement un COPIL extraordinaire avec la Direction.

2.6 Mesure de l'impact de la méthodologie

❖ Constat clé

Une méthodologie qui ne se mesure pas s'érode. Pour démontrer la valeur du PMO et justifier son budget de fonctionnement, la cellule s'engage sur une **mesure objective de l'impact** de la méthodologie sur quatre dimensions : **qualité, coûts, délais, adhésion**. Une **baseline T0** est figée à la mise en service du référentiel (mai 2026) ; les mesures sont reconduites à **T+6 mois** (novembre 2026) puis **T+12 mois** (mai 2027).

Dispositif de mesure — 4 axes, 12 indicateurs

Axe	Indicateur	Cible T+12	Fréquence	Source / Méthode
Qualité — les projets livrent le bon résultat				
Qualité	Taux de jalons tenus à ± 5 j	$\geq 85\%$	Mensuelle	Cockpit DSI / P3-13
Qualité	Défauts post-mise en production (sev. 1-2)	-30% vs T0	Mensuelle	Log anomalies P3-15
Qualité	Satisfaction client / métier (CSAT après recette)	$\geq 4,0/5$	Par projet	PV recette P5-19 + sondage post-Go-Live
Coûts — les engagements financiers sont tenus				
Coûts	IPC moyen du portefeuille (CPI)	$\geq 0,95$	Mensuelle	Cockpit DSI (EVM)
Coûts	Écart budgétaire portefeuille (prévu vs réel)	$\leq +5\%$	Mensuelle	P2-08 + cockpit
Coûts	Taux de dépassement (projets en rouge coûts)	≤ 1 projet sur 11	Mensuelle	RAG cockpit
Délais — les engagements de planning sont tenus				
Délais	IPD moyen du portefeuille (SPI)	$\geq 0,95$	Mensuelle	Cockpit DSI (EVM)
Délais	Taux de demandes de changement absorbées sans glissement Go-Live	$\geq 80\%$	Par projet	P3-14 + Gantt baseline
Délais	Délai moyen de production d'un livrable type (charte, PMP, CR)	-40% vs T0	Trimestrielle	Mesure d'effort CP
Adhésion — la méthodologie est appropriée par les équipes				
Adhésion	Taux d'utilisation des templates (projets actifs)	$\geq 90\%$	Trimestrielle	Audit PMO sur SharePoint
Adhésion	Satisfaction CP sur le référentiel (NPS interne)	$NPS \geq +30$	Semestrielle	Sondage anonyme 5 CP
Adhésion	Bien-être équipe (eNPS portefeuille)	$\geq +20$	Semestrielle	Sondage DSI 21 pers.

Calendrier et gouvernance de la mesure

Jalon	Date	Activité	Restitution
T0	Mai 2026	Figurer la baseline (12 indicateurs renseignés à l'instant zéro)	Annexe « baseline PMO »
T+3	Août 2026	Première lecture indicative (qualité, coûts, délais)	Revue PMO trimestrielle
T+6	Novembre 2026	Premier point d'étape complet incluant adhésion	COPIL stratégique mensuel
T+12	Mai 2027	Bilan annuel d'impact et arbitrages sur le référentiel	COPIL semestriel + revue Direction

Mode opératoire de l'enquête d'adhésion

- **Sondage CP (5 répondants)** — 10 questions en échelle de Likert (1–5) sur la clarté des templates, l'utilité des rituels, la pertinence des indicateurs et la charge de reporting. Une question ouverte : « Quel template ou rituel supprimeriez-vous demain matin ? ».
- **Sondage équipes DSI (21 répondants)** — 5 questions sur la lisibilité du portefeuille, la charge mentale, le sentiment de surcharge et la qualité des arbitrages. Anonymisé, hébergé sur Microsoft Forms (Office 365).
- **Entretiens directions métier** (Marketing, Commerce, RH, Finance) — 30 min par direction sur la valeur perçue des livrables PMO (cockpit, RAG portefeuille, COPIL).
- **Restitution** — synthèse en 1 slide pour le COPIL, intégrée à la fiche REX P5-23 du référentiel.

✓ Recommandation

Sans baseline, aucune comparaison ne sera crédible. La **première priorité opérationnelle du PMO** (semaine du 25/05/2026) est donc de figer les 12 valeurs T0 dans une page dédiée du Cockpit DSI (onglet « Mesure d'impact »), afin que toutes les évolutions ultérieures soient quantifiables et opposables en COPIL.

▲ Point d'alerte

Biais à surveiller. (i) Les sondages d'adhésion menés par le PMO lui-même introduisent un biais d'auto-évaluation : confier leur dépouillement à la DRH garantit l'indépendance. (ii) Les indicateurs EVM (IPC/IPD) supposent une baseline budgétaire propre : un projet sans baseline figée ne sera pas inclus dans les agrégats. (iii) Le taux d'utilisation des templates doit distinguer *usage formel* (fichier déposé) et *usage réel* (champs renseignés) : l'audit PMO échantillonne 2 projets/trimestre en revue qualitative.

Référentiel documentaire commun

❖ Constat clé

Le référentiel documentaire est l'instrument central de **professionnalisation du PMO** : il garantit l'homogénéité des pratiques et la traçabilité. Chaque chef de projet dispose d'un catalogue de **26 documents-types** hébergés sur SharePoint Online (projet Office 365 en déploiement) et matérialisés dans le présent dépôt par autant de templates LaTeX. Aucun coût additionnel.

3.1 Principe du référentiel

- **1 template = 1 fichier .tex** dans le dossier `referentiel/`, et 1 PDF compilé dans `referentiel/pdf/`.
- **Chaque projet du portefeuille instancie** les templates dans un sous-dossier `projets/<nom_projet>/` en remplaçant les champs en italique par les données réelles.
- **Versionnage** : chaque template a un identifiant stable (**Pn-NN**) où **n** = phase et **NN** = numéro d'ordre.
- **Granularité d'usage** : certains documents sont produits *une fois* (charte, PMP, baselines), d'autres sont *vivants* (registre risques, rapport mensuel), d'autres sont *récurrents* (CR de réunion).

3.2 Catalogue des 26 templates — chemins et fréquence

Tous les chemins sont relatifs à la racine du dépôt. Préfixe source : `referentiel/`; préfixe sortie : `referentiel/pdf/`.

ID	Document	Fréq.	Source (.tex)	Sortie PDF
Phase 1 — Démarrage				
P1-01	Charte projet	Une fois	P1-01_charte_projet.tex	P1-01_charte_projet.pdf
P1-02	Note de cadrage	Une fois	P1-02_note_de_cadrage.tex	P1-02_note_de_cadrage.pdf
P1-02bis	Product Breakdown Structure (PBS)	Une fois + révisions	P1-02bis_pbs.tex	P1-02bis_pbs.pdf
P1-02ter	Cahier des charges (CDC)	Une fois + révisions	P1-02ter_cdc.tex	P1-02ter_cdc.pdf
P1-03	Fiche d'identification	Une fois	P1-03_fiche_identification.tex	P1-03_fiche_identification.pdf
P1-04	Matrice RACI	MAJ si besoin	P1-04_matrice_raci.tex	P1-04_matrice_raci.pdf
Phase 2 — Planification				

ID	Document	Fréq.	Source (.tex)	Sortie PDF
P2-05	Plan de Management Projet	Une fois + révisions	P2-05_plan_management_projet.tex	P2-05_plan_management_projet.pdf
P2-06	WBS (Work Breakdown)	Une fois + révisions	P2-06_wbs.tex	P2-06_wbs.pdf
P2-07	Planning Gantt	Mensuel	P2-07_planning_gantt.tex	P2-07_planning_gantt.pdf
P2-08	Budget prévisionnel + EVM	Une fois + révisions	P2-08_budget_previsionnel.tex	P2-08_budget_previsionnel.pdf
P2-09	Registre des risques	Mensuel	P2-09_registre_risques.tex	P2-09_registre_risques.pdf
P2-10	Plan de communication	Une fois	P2-10_plan_communication.tex	P2-10_plan_communication.pdf
P2-11	Plan de conduite du changement	Selon jalons	P2-11_plan_conduite_changement.tex	P2-11_plan_conduite_changement.pdf
Phase 3 — Exécution				
P3-12	CR de réunion (hebdo/sprint)	Hebdomadaire	P3-12_cr_reunion.tex	P3-12_cr_reunion.pdf
P3-13	Rapport d'avancement mensuel	Mensuel	P3-13_rapport_avancement.tex	P3-13_rapport_avancement.pdf
P3-14	Demande de changement	À l'occurrence	P3-14_demande_changement.tex	P3-14_demande_changement.pdf
P3-15	Log des anomalies	Vivant	P3-15_log_anomalies.tex	P3-15_log_anomalies.pdf
Phase 4 — Maîtrise				
P4-16	Tableau de bord projet	Mensuel	P4-16_tableau_bord_projet.tex	P4-16_tableau_bord_projet.pdf
P4-17	Rapport d'écarts	En cas d'écart	P4-17_rapport_ecarts.tex	P4-17_rapport_ecarts.pdf
P4-18	CR / Slides COPIL	Mensuel	P4-18_cr_copil.tex	P4-18_cr_copil.pdf
Phase 5 — Clôture				
P5-19	PV de recette fonctionnelle	Une fois	P5-19_pv_recette_fonctionnelle.tex	P5-19_pv_recette_fonctionnelle.pdf
P5-20	PV de recette technique	Une fois	P5-20_pv_recette_technique.tex	P5-20_pv_recette_technique.pdf
P5-21	Rapport de clôture	Une fois	P5-21_rapport_cloture.tex	P5-21_rapport_cloture.pdf
P5-22	PV transfert exploitation	Une fois	P5-22_pv_transfert_exploitation.tex	P5-22_pv_transfert_exploitation.pdf
P5-23	Fiche REX	Une fois	P5-23_fiche_rex.tex	P5-23_fiche_rex.pdf

ID	Document	Fréq.	Source (.tex)	Sortie PDF
P5-24	Lettre de fin de mission ESN	Une fois	P5-24_lettre_fin_mission_esn.tex	P5-24_lettre_fin_mission_esn.pdf

✓ Recommandation

Le **dossier compagnon PMP Refonte Web** (cf. Ch. 7) démontre l'instanciation de **15 de ces 26 templates** sur le projet Refonte Web. Les 11 templates restants (P3-14, P3-15, P4-16–18, P5-19–24) seront instanciés au fil de l'avancement du projet.

Documents contractuels de clôture (Phase 5). Ils couvrent les deux périmètres exigés : **en interne** — PV de recette fonctionnelle (P5-19) et technique (P5-20), rapport de clôture (P5-21), fiche REX (P5-23) ; **côté prestataires (ESN)** — PV de transfert d'exploitation (P5-22) et **lettre de fin de mission ESN** (P5-24, solde du forfait, levée des réserves et décharge contractuelle). Le template de PV de recette est fourni (P5-19/P5-20).

3.3 Référentiel d'indicateurs en cascade — projet $\Rightarrow$ PMO

❖ Constat clé

Ce référentiel organise les indicateurs en **deux niveaux hiérarchiques** : les **indicateurs projet** (niveau opérationnel) et les **indicateurs PMO** (niveau portefeuille — agrégats). La relation est **strictement unidirectionnelle** : les indicateurs projet *nourrissent* les indicateurs PMO, jamais l'inverse. Le chef de projet pilote ; le PMO consolide et arbitre.

Principe de cascade

Indicateur Projet		Indicateur PMO (agrégat)	Fréq.
Avancement WBS (% tâches réalisées)	$\Rightarrow$	Avancement moyen portefeuille	Mensuel
IPC — Indice Performance Coût	$\Rightarrow$	% projets dans le budget ($\geq 0,9$)	Mensuel
IPD — Indice Performance Délai	$\Rightarrow$	% projets dans les délais ($\geq 0,9$)	Mensuel
Satisfaction client interne	$\Rightarrow$	Satisfaction client PMO (moyenne portefeuille)	Par clôture
Satisfaction équipe (score /5)	$\Rightarrow$	Bien-être équipe (moyenne portefeuille)	Par sprint
Anomalies bloquantes ouvertes	$\Rightarrow$	% projets sans anomalie bloquante	Hebdom.

▲ Point d'alerte

Les indicateurs PMO **ne redescendent pas** vers les projets : ils informent la direction et orientent les décisions de portefeuille (priorisation, ressources, arbitrages budgétaires). La **responsabilité du pilotage reste au chef de projet**. Toute action corrective est décidée par le chef de projet, pas par le PMO.

Indicateurs de pilotage projet — Coûts / Délais / Qualité

Axe	Indicateur	Calcul / Source	Cible	Seuil alerte	Fréq.
Coûts	Budget consommé / prévu	Comptabilité	$\leq 100 \%$	$> 110 \%$	Mensuel
	IPC (Valeur acquise)	VA/CR (EVM)	$\geq 0,9$	$< 0,8$	Mensuel
	Réserve pour aléas restante	Budget initial	$> 0 \%$	$< 5 \%$	Mensuel
Délais	Jalons respectés / planifiés	Planning	$= 100 \%$	$< 80 \%$	Mensuel
	IPD (Valeur acquise)	VA/VP (EVM)	$\geq 0,9$	$< 0,8$	Mensuel
	Retard cumulé (j. ouvrés)	Planning	0 jour	$> 10 j$	Mensuel
Qualité	Taux de couverture des tests	Log anomalies	$\geq 80 \%$	$< 60 \%$	Par sprint
	Anomalies bloquantes ouvertes	Log anomalies	0	> 2	Hebdom.
	Taux de satisfaction recette	Questionnaire métier	$\geq 85 \%$	$< 70 \%$	À la recette

Indicateurs de supervision du portefeuille (agrégats)

Indicateur PMO	Nourri par (projet)	Cible	Seuil alerte	Fréquence
Avancement moyen portefeuille	Avancement WBS (chaque projet)	Selon phase	Écart > 10 pts	Mensuel
% projets dans le budget	$IPC \geq 0,9$ par projet	$\geq 85 \%$	$< 70 \%$	Mensuel
% projets dans les délais	$IPD \geq 0,9$ par projet	$\geq 80 \%$	$< 65 \%$	Mensuel
Satisfaction client PMO	Satisfaction client interne (par projet)	≥ 80	< 65	Par clôture
Bien-être équipe PMO	Note satisfaction équipe (par projet)	$\geq 4,0/5$	$< 3,5$	Par sprint
Nb de projets en alerte	Statut RAG exécution (par projet)	0 Rouge	≥ 2 Rouge	Hebdom.
Budget total engagé	Budget consommé (somme 11 projets)	$\leq 1\,700\text{ K€}$	$> 1\,785\text{ K€}$	Mensuel

Indicateurs opérationnels (infrastructure et incidents)

Indicateur	Définition	Cible	Seuil alerte	Fréquence
Uptime moyen (9 serveurs)	% disponibilité des serveurs on-premise	$\geq 99\%$	$< 98\%$	Temps réel
Incidents P1 actifs	Incidents critiques (service arrêté) ouverts	0	≥ 1	Temps réel
Incidents P2 actifs	Incidents majeurs (dégradation service) ouverts	0	≥ 3	Quotidien
Délai moyen résolution P1	Délai entre ouverture et clôture d'un P1	$\leq 5j$	$> 5j$	Par incident
Points bloquants ESN ouverts	Nb de blocages inter-équipes non levés	0	≥ 2	Hebdomadaire
Ancienneté dernier CR ESN	Nb de jours depuis le dernier compte-rendu	$\leq 14j$	$> 30j$	Mensuel

Indicateurs d'efficacité de la méthodologie PMO

❖ Constat clé

Ces indicateurs mesurent la **valeur ajoutée du PMO** par rapport au mode de fonctionnement antérieur (avant 2026, sans cadre méthodologique partagé). Aucune mesure formelle n'existait avant la mise en place de la cellule PMO : la colonne « Avant PMO » décrit qualitativement la situation 2025 et la première campagne de mesure 2026 constituera la **vraie baseline** pour l'amélioration continue. Quatre axes structurent ces indicateurs : **Qualité, Coût, Délai, Adhésion CP**.

Axe	Indicateur	Avant PMO (qualitatif)	Cible 2026	Source
Qualité	Anomalies bloquantes post go-live / projet	Pas de comptage formel, ressenti CP « beaucoup »	≤ 5	Log anomalies (P3-15)
	Taux de respect du périmètre validé	Aucune baseline, scope creep fréquent	$\geq 90\%$	PV recette (P5-19)
Coût	Écart budget réalisé / prévu (portefeuille)	Pas de suivi EVM, dépassements a posteriori	$\leq +5\%$	Budget P2-08 + Cockpit
	Réserve aléas restante en clôture	Réserve consommée systématiquement	$\geq 0\%$	Rapport clôture (P5-21)
Délai	% jalons critiques respectés	Suivi informel, glissements non tracés	$\geq 80\%$	Gantt (P2-07)
	Retard moyen go-live	Aucune mesure consolidée	$\leq 10j$	Cockpit DSI
Adhésion CP	Taux de réutilisation du référentiel	Référentiel inexistant (0 % par construction)	$\geq 60\%$	Audit PMO mensuel
	NPS interne des CP sur la méthode	Pas d'enquête	$\geq +30$	Enquête semestrielle PMO
	Présence COPIL mensuel (5 CP)	Comitologie ad hoc, taux non mesuré	$\geq 95\%$	Feuille d'émargement

Mode de collecte : ces indicateurs sont renseignés en fin de chaque clôture projet (P5-21 — Rapport de clôture) et consolidés annuellement par le PMO en **tableau de bord de progression méthodologique**, présenté en Comité Stratégique de T1 (N+1). La progression observée d'une année sur l'autre alimente la révision de la pondération du modèle de priorisation (§1.4) et les ajustements de la méthodologie (Ch. 2).

✓ Recommandation

Lecture croisée : le Cockpit DSI (Ch. 4) permet au DSI de passer de la vue macro (portefeuille, budget global, bien-être équipe) à la vue micro (KPIs d'un projet, détail d'un incident) en un seul clic. La cohérence entre les niveaux — projet, portefeuille, opérationnel, efficacité méthodologique — garantit qu'aucun signal faible ne passe entre les mailles.

Tableau de bord de supervision — Cockpit DSI

❖ Constat clé

Le Cockpit DSI est l'**implémentation opérationnelle** du tableau de bord de supervision. Il remplace tout tableau Excel partagé et élimine les délais de consolidation : les données sont mises à jour en continu par les chefs de projet et consultées sans délai par le DSI.

4.1 Architecture technique

Couche	Technologie	Rôle
Backend	Node.js + Express	Serveur REST — routes API, gestion des collections, persistance
Données	db.json	Base de données fichier — 7 collections : <code>projects</code> , <code>incidents</code> , <code>servers</code> , <code>esn_contacts</code> , <code>blocking_points</code> , <code>patches</code> , <code>crm_kpis</code>
Frontend	HTML/CSS + Chart.js	Interface SPA mono-page — 5 onglets, graphiques dynamiques, modales d'édition
Hébergement	Interne DSI	<code>http://localhost:3001</code> — disponible sur le réseau LAN du siège

4.2 API REST — Endpoints de supervision


Route	Méthode	Description
/api/projects	GET	Liste des 11 projets — score de priorisation, RAG, avancement, chef, ESN
/api/projects/:id	PATCH	Mise à jour avancement, RAG exécution, budget consommé, chef, ESN
/api/stats	GET	Agrégats portefeuille : budget total engagé, nombre d'alertes, uptime moyen
/api/incidents	GET/POST	Incidents actifs P1/P2/P3 — créer, faire progresser, résoudre
/api/blocking	GET/POST	Points bloquants — ouvrir, lever, suivre par responsable
/api/esn	GET/PATCH	Contacts ESN — CRs, notes de satisfaction, ancienneté dernier contact
/api/patches	GET/POST	Livrables ESN — patch notes et dates de livraison
/api/crm	GET/PATCH	KPIs, jalons, risques et points de vigilance COPIL d'un projet
/api/servers	GET/PATCH	Uptime et statut RAG des 9 serveurs on-premise

4.3 Les 5 onglets du Cockpit


Onglet	Contenu	Correspond à
Portefeuille	Stat cards, rituels PMO, modèle de priorisation, tableau des 11 projets éditables, graphique score par projet, budget mensuel	Ch. 1 (gouvernance) + Ch. 2 (méthodo)
Projet (pilotage)	Jalons J1→J5, budget par poste, fiche KPI mensuelle RAG, registre des risques, vigilance et décisions COPIL	Partie II (Refonte Web)
Vélocité	Déploiements hebdomadaires, burn-down sprint, charge par développeur, répartition j/h par projet	Pilier 2 (§2.3)
Ops & Risques	Uptime 9 serveurs, incidents P1/P2/P3, radar risques vs importance, KPIs PMO	§3.4 (indicateurs ops)
ESN	Contacts par ESN, ancienneté CRs, points bloquants, livrables patch notes	Pilier 3 (§2.4)

✓ Recommandation

Chaque chef de projet met à jour son avancement et son RAG directement dans le Cockpit (bouton [edit] dans le tableau portefeuille) — sans passer par un email ou un fichier partagé. Le DSI consulte l'état consolidé en temps réel. Le rapport mensuel papier (P3-13) reste produit pour archivage et COPIL formel.

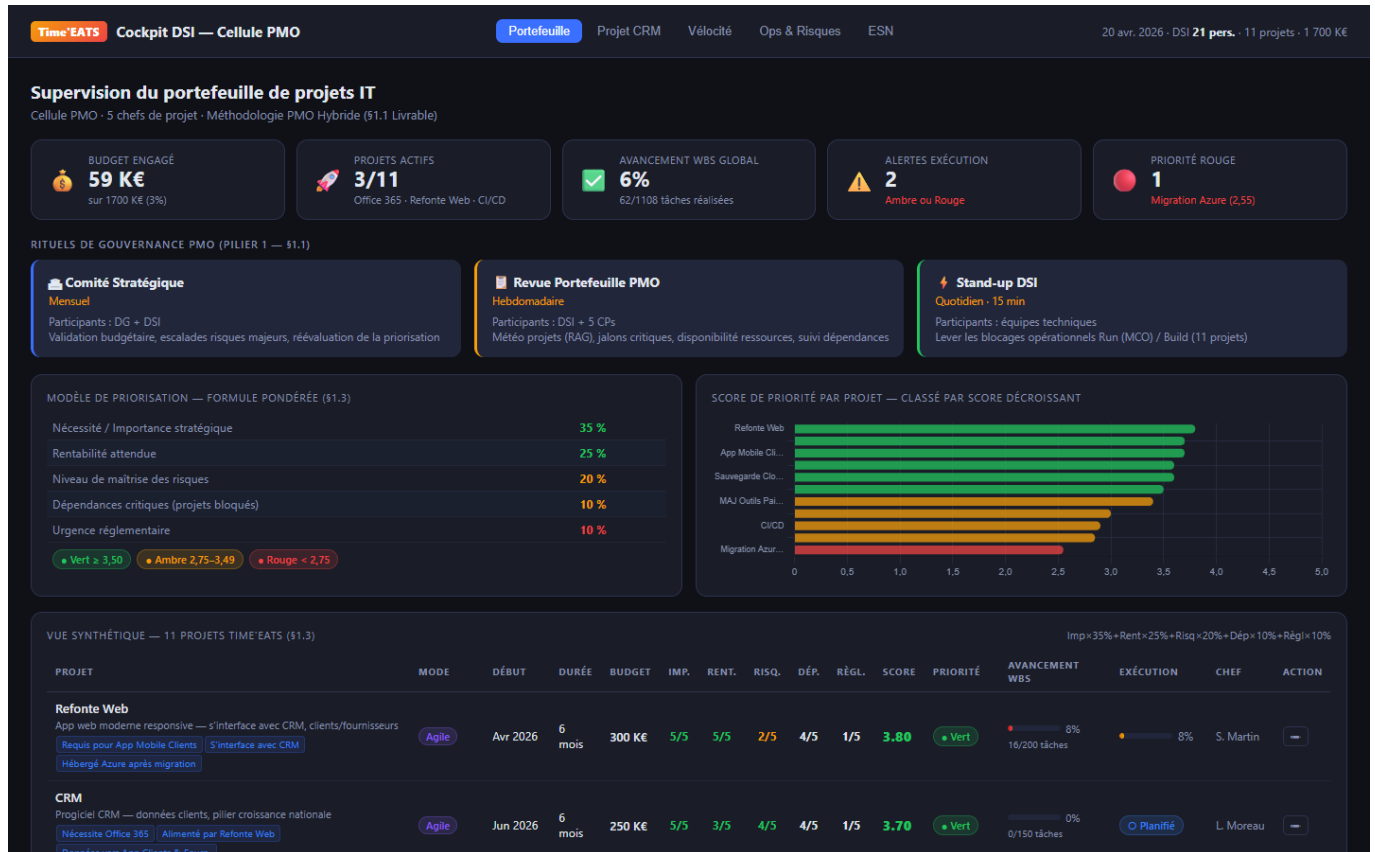

Capture — Onglet Portefeuille : supervision des 11 projets, score de priorisation, RAG exécution.

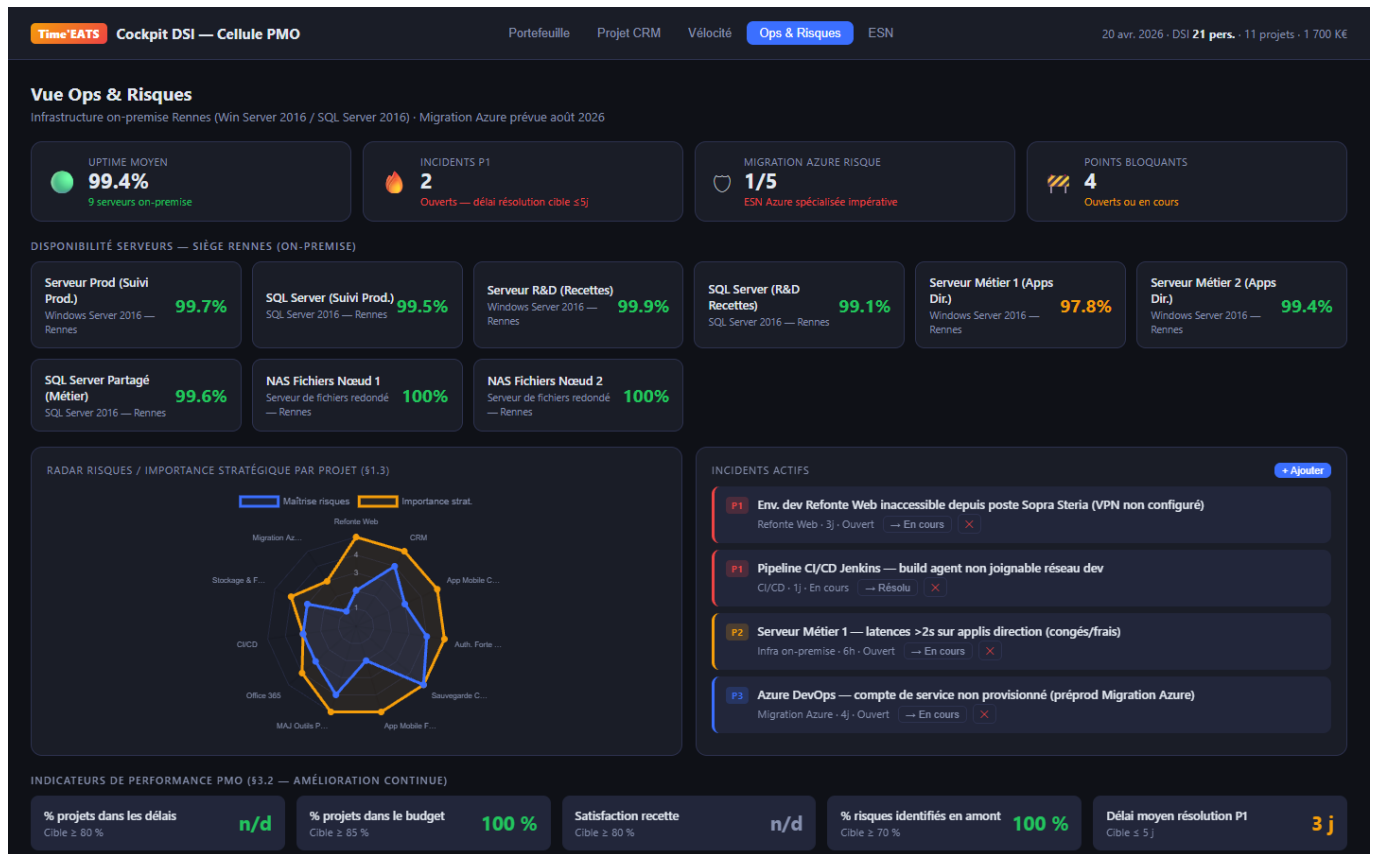

Capture — Onglet Ops & Risques : uptime serveurs, incidents P1/P2/P3, KPIs PMO.

4.4 Capitalisation et amélioration continue

La DSI pilote 11 projets avec 5 chefs de projet. Sans capitalisation structurée, chaque erreur sera répétée et chaque bonne pratique perdue. L'amélioration continue est un **levier de productivité immédiat** — et sa mise en œuvre ne requiert aucun budget supplémentaire.

Processus de capitalisation — 4 étapes

Étape	Activité	Description	Outil
1	Rétrospective de clôture	Séance 2h avec l'équipe : ce qui a fonctionné, ce qui a posé problème, 3 actions d'amélioration	Teams / Miro
2	Rédaction fiche REX (P5-23)	Synthèse structurée : contexte, enseignements, recommandations, fichiers liés	SharePoint O365
3	Mise à jour du référentiel	Templates concernés mis à jour, bonnes pratiques PMO enrichies	SharePoint O365
4	Revue semestrielle PMO	Analyse des REX accumulés, patterns récurrents, mise à jour du référentiel	COPIL semestriel

Boucle PDCA appliquée au PMO

— **Plan** : Définir les processus PMO et les templates du référentiel (Ch. 3 du présent livrable).

- **Do** : Appliquer le référentiel sur chaque projet du portefeuille (Partie II : exemple Refonte Web).
- **Check** : Collecter les REX à la clôture ; mesurer les indicateurs PMO (respect budgétaire, taux de jalons, satisfaction métier).
- **Act** : Mettre à jour le référentiel sur la base des enseignements ; présenter au COPIL semestriel.

✓ Recommandation

Cette démarche ne représente **aucun coût additionnel** : le Cockpit DSI s'appuie sur Node.js (runtime gratuit) et SharePoint Online (déjà financé par le projet Office 365). La satisfaction client et le bien-être équipe remontent naturellement du niveau projet vers le PMO — sans double saisie.

Deuxième partie

Application au projet Refonte Web

Cadrage du projet Refonte Web

❖ Constat clé

La **Refonte Web** est le projet le mieux noté du portefeuille (score 3,80/5 — RAG Vert). Elle constitue la **pierre angulaire de l'écosystème digital cible** : socle commun à toute la transformation (CRM, App Clients, App Fournisseurs) via une API publique, et levier de conversion direct pour Marketing et Commerce. Démarrage 22/04/2026 — Go-Live impératif 30/09/2026 — Budget ferme 300 K€.

5.1 Carte d'identité du projet

Champ	Valeur	Champ	Valeur
Code projet	REF-WEB-2026	Statut au 19/05	Vert — 8 % avancement
Chef de projet	M. X	Sponsor	Mme Y (DSI)
Date de démarrage	22/04/2026	Date de Go-Live	30/09/2026
Budget total	300 K€ (ferme)	Mode	Hybride (Waterfall + Scrum)
ESN partenaire	Sopra Steria (forfait 400 j/h — 200 K€)	PMO référent	M. L
Hébergement	Azure West Europe (Paris)	Conformité	RGAA 4.1 AA + RGD + OWASP ASVS 2

5.2 Enjeux et objectifs SMART

#	Objectif	Mesure	Cible	Échéance
O1	Trafic organique national	Sessions GA4	+30 % vs T1 2026	M+6 post Go-Live
O2	Taux de conversion	Funnel commande	1,0 % → 2,2 %	M+9
O3	Performance Web Vitals	Lighthouse Perf./A11y	≥ 90 sur 10 parcours	J5 (Go-Live)
O4	Délai de publication CMS	Mesure CMS (création → publication)	< 30 min (vs 5 j)	J5+30
O5	API REST v1 documentée	OpenAPI 3.0 + couverture tests	100 % endpoints publics	J2 (30/06)
O6	TCO à 12 mois	Hébergement + licences + run	−25 % vs Drupal legacy	M+12

5.3 Périmètre et options

Description	
In	Site corporate (10 templates UX/UI), CMS contributeur autonome, espace client (compte, commandes, factures), API publique REST v1, SEO technique, conformité RGAA 4.1 AA / RGPD, SSO Office 365 (ou IdP local en repli), CI/CD multi-env, monitoring APM.
Out	Refonte CRM (projet dédié), applications mobiles, tunnel B2B avancé, back-office logistique, migration contenus legacy antérieurs 2024, refonte intranet collaborateur.

> Choix retenu

Trois options étudiées (cf. `projets/refonte_web/P1-02_note_de_cadrage.tex`, §7) : **Option A retenue** (refonte complète Next.js + Headless CMS + API), Option B (upgrade Drupal incrémental — écartée car n’adresse pas l’industrialisation), Option C (SaaS Shopify/Salesforce — écartée pour verrouillage éditeur).

5.4 Approche hybride retenue

- **Phases 1, 2 et 5 (Démarrage, Planification, Clôture) en Waterfall** : baselines contractuelles (charte, PMP, WBS, Gantt, budget, risques), recette PV, transfert exploitation.
- **Phases 3 et 4 (Exécution, Maîtrise) en Scrum 2 semaines** : 8 sprints prévus (S22 à S37), démos COPIL aux jalons J1–J4, vélocité tracée dans Azure DevOps Boards.
- **Gouvernance** : COPIL mensuel (3^e mardi), daily Scrum quotidien, revue/rétrospective bi-mensuelle, rapport d’avancement à l’**ouverture** de chaque mois.

Pilotage opérationnel du projet Refonte Web

6.1 Jalons baseline


N°	Jalon	Date baseline	Condition de franchissement
J0	Kick-off projet	22/04/2026	Charte signée + équipe staffée
J1	Maquettes UX validées	27/05/2026	Design system v1 + parcours-clés signés MOA
J2	Socle technique validé	30/06/2026	API v1 testée + CI/CD opérationnelle + envs prêts
J3	MVP fonctionnel staging	31/07/2026	Site + CMS + espace client en démo MOA
J4	Recette + audits OK	31/08/2026	PV recette signé + RGAA AA + OWASP ASVS 2
J5	Go-Live production	30/09/2026	Bascule réussie + monitoring run + REX

6.2 WBS — vue tabulaire synthétique

Lot	Libellé	Charge (j.h)	Responsable
1	Démarrage	14	CP (M. X)
2	Planification	28	CP + PMO
3	UX/UI & Design System	63	UX (Mme C) + ESN
4	Socle technique & API	88	Tech Lead (M. A) + ESN
5	Réalisation produit	202	ESN Sopra Steria + équipe interne
6	Qualité & Recette	65	RSSI + ESN + audits externes
7	Conduite du changement	20	CP + Marketing
8	Clôture & Go-Live	22	CP + DSI Ops
TOTA		~480 j.h	(incl. ESN 400 j.h forfait)

Détail complet par work package : cf. [projets/refonte_web/pdf/P2-06_wbs.pdf](#).

6.3 WBS — vue graphique



WBS Refonte Web — arborescence à 3 niveaux : projet → 8 lots → 34 work packages.

6.4 Budget — synthèse

Poste	Type	Montant	Commentaire
Intégration ESN Sopra Steria	CAPEX	200 K€	Forfait 400 j/h
Ressources internes valorisées	Interne	80 K€	4,5 ETP cumulés sur 6 mois
Licences & SaaS (CMS, Figma, APM)	OPEX	7 K€	Sur la durée du projet
Hébergement Azure West Europe	CAPEX	6 K€	3 environnements 6 mois
Audits externes (RGAA + OWASP)	OPEX	4 K€	1 audit + 1 pentest
Réserve pour aléas	Réserve	3 K€	Sur arbitrage COPIL
TOTAL		300 K€	Ventilation détaillée P2-08

Détail mensuel + suivi EVM : cf. [projets/refonte_web/pdf/P2-08_budget_previsionnel.pdf](#).

6.5 Risques majeurs (top 7)

#	Risque	P	I	Score	Mitigation
R1	Retard Office 365 / SSO	3	4	12	Repli IdP local prévu (8 K€ provisionnés)
R2	Non-conformité RGAA 4.1 AA	3	4	12	Pré-audit S30 + revue UX experte
R3	Sous-effectif ESN sprint critique	3	3	9	Clause continuité + backup nominatif
R4	Indispo. référent Marketing	2	4	8	Suppléant désigné + créneaux sanctuarisés
R5	Migration Azure non finalisée à J2	2	4	8	Coord. weekly Infra + tenant repli
R6	Web Vitals dégradés	3	3	9	Lighthouse en CI + budget JS < 200 ko
R7	Vulnérabilité OWASP critique	2	5	10	SAST/CodeQL + threat modeling + code review RSSI

Registre complet : cf. [projets/refonte_web/pdf/P2-09_registre_risques.pdf](#).

6.6 Tableau de bord projet (cockpit) — état au 19/05/2026

Indicateur	Valeur	Seuil	Statut	Commentaire
Avancement physique	8 %	Selon phase	Vert	Conforme phase Planification
Budget consommé	35 K€ (11,7 %)	≤ % av. +5pt	Ambre	Légère avance consommation
IPC	0,98	≥ 0,95	Vert	Aligné valeur acquise
IPD	0,93	≥ 0,95	Ambre	PMP livré J+2
Jalons respectés	100 %	≥ 80 %	Vert	J0 OK, J1 en trajectoire
Risques critiques actifs	0	0	Vert	7 risques Élevés, 0 Critique
Anomalies bloquantes	0	0	Vert	Aucune ouverte

Rapport d'avancement détaillé : cf. [projets/refonte_web/pdf/P3-13_rapport_avancement.pdf](#).

Dossier PMP Refonte Web — documents instanciés

❖ Constat clé

Le pilotage opérationnel de la Refonte Web s'appuie sur un **dossier compagnon** (`pmp_refonte_web.pdf`) qui rassemble les **15 documents instanciés** à partir des templates du référentiel (Ch. 3). Chaque document est compilé en PDF autonome dans `projets/refonte_web/pdf/`. Le présent chapitre fait office d'**index navigationnel**.

7.1 Architecture du dossier compagnon

- **Document maître** : `pmp_refonte_web.pdf` — index, carte d'identité, table des documents instanciés, engagements contractuels.
- **Document pivot** : `P2-05_plan_management_projet.pdf` — Plan de Management Projet en 11 sections (PMBOK 7^e + PRINCE2 + ADKAR).
- **14 documents annexes** — charte, note de cadrage, PBS, CDC, fiche d'identification, RACI, WBS, Gantt, budget, risques, communication, conduite du changement, CR de réunion (kick-off), rapport d'avancement (M+1).

7.2 Index des 15 documents instanciés

Tous les chemins sont préfixés par `projets/refonte_web/pdf/` et le fichier source équivalent se trouve dans `projets/refonte_web/`.

ID	Document	Phase	Fichier PDF instancié	Statut
Phase 1 — Démarrage				
P1-01	Charte projet	Démarrage	<code>P1-01_charte_projet.pdf</code>	Vert
P1-02	Note de cadrage	Démarrage	<code>P1-02_note_de_cadrage.pdf</code>	Vert
P1-02bis	Product Breakdown Structure (PBS)	Démarrage	<code>P1-02bis_pbs.pdf</code>	Vert
P1-02ter	Cahier des charges (CDC)	Démarrage	<code>P1-02ter_cdc.pdf</code>	Vert
P1-03	Fiche d'identification	Démarrage	<code>P1-03_fiche_identification.pdf</code>	Vert
P1-04	Matrice RACI	Démarrage	<code>P1-04_matrice_raci.pdf</code>	Vert
Phase 2 — Planification				
P2-05	Plan de Management Projet (pivot)	Planification	<code>P2-05_plan_management_projet.pdf</code>	Vert
P2-06	WBS (tabulaire + graphique PNG)	Planification	<code>P2-06_wbs.pdf</code>	Vert
P2-07	Planning Gantt baseline	Planification	<code>P2-07_planning_gantt.pdf</code>	Vert

ID	Document	Phase	Fichier PDF instancié	Statut
P2-08	Budget prévisionnel + EVM	Planification	P2-08_budget_previsionnel.pdf	Vert
P2-09	Registre des risques v1	Planification	P2-09_registre_risques.pdf	Vert
P2-10	Plan de communication	Planification	P2-10_plan_communication.pdf	Vert
P2-11	Plan de conduite du changement	Planification	P2-11_plan_conduite_changement.pdf	Vert
Phase 3 — Exécution (exemples)				
P3-12	CR Kick-off (22/04/2026)	Exécution	P3-12_cr_reunion.pdf	Vert
P3-13	Rapport d'avancement (mai 2026)	Exécution	P3-13_rapport_avancement.pdf	Vert

7.3 Documents à produire au fil de l'avancement

❖ Constat clé

Au-delà des 15 documents déjà instanciés, le pilotage Phase 3–5 génère les livrables suivants à produire au fil de l'eau à partir des templates du référentiel.

ID	Document	Fréquence	Première occurrence prévue
P3-12 (suite)	CR de réunion sprint / COPIL	Tous les 15 j / Mensuel	Sprint 1 Review — 13/06/2026
P3-13 (suite)	Rapport d'avancement mensuel	Mensuel	Juin 2026 (diffusé 05/07)
P3-14	Demande de changement	Sur événement	À anticiper en juillet
P3-15	Log des anomalies	Vivant	Dès la recette (août 2026)
P4-16	Tableau de bord projet	Mensuel	Mai 2026 (intégré cockpit)
P4-17	Rapport d'écarts	Sur seuil dépassé	Si IPC ou IPD < 0,90
P4-18	CR / Slides COPIL	Mensuel	COPIL inception 20/05/2026
P5-19	PV de recette fonctionnelle	1 fois	31/08/2026 (J4)
P5-20	PV de recette technique	1 fois	31/08/2026 (J4)
P5-21	Rapport de clôture	1 fois	30/09/2026 (J5)
P5-22	PV transfert exploitation	1 fois	30/09/2026 (J5)
P5-23	Fiche REX	1 fois	15/10/2026 (J5+15)
P5-24	Lettre de fin de mission ESN	1 fois	30/09/2026 (solde Sopra Steria)

✓ Recommandation

À chaque nouvelle occurrence d'un document Phase 3–5, le CP :

1. Duplique le template depuis `referentiel/` vers `projets/refonte_web/`.
2. Renseigne les champs spécifiques au projet et compile en PDF dans `projets/refonte_web/pdf/`.
3. Met à jour la table de la section 2 du dossier compagnon `pmp_refonte_web.pdf`.
4. Versionne dans SharePoint et notifie le PMO pour intégration au cockpit DSI.

▲ Point d'alerte

Document maître : en cas de divergence entre ce livrable principal et le dossier compagnon `pmp_refonte_web.pdf`, c'est le **dossier compagnon** qui fait **foi pour le projet Refonte Web** (granularité plus fine, données à jour). Le présent livrable sert de référence **méthodologique** pour l'ensemble du portefeuille.
