

Product Breakdown Structure (PBS)

Phase 1 — Démarrage | Projet : Refonte Web

Projet		Date	
Nom	Refonte Web Time'Eats	Rédacteur	S. MARTIN (CP)
Code	RW-2026	Version	1.0 (15/04/2026)


1 — Objet du document

Ce PBS décompose le produit **Refonte Web Time'Eats** en 7 sous-systèmes et 24 composants. Il sert de base au CDC (P1-02ter), au WBS (P2-06) et au budget (P2-08). Il reflète le périmètre *Inclus* défini dans la Note de cadrage (P1-02) et le PMP (P2-05 §2).

2 — Vue arborescente synthétique

Le diagramme page suivante (généré depuis `pbs_refonte_web.puml` via PlantUML) présente la décomposition produit à 3 niveaux : Produit → Sous-systèmes → Composants. La page est en orientation paysage pour préserver la lisibilité des 24 composants.

PBS — Refonte Web Time'Eats (RW-2026)

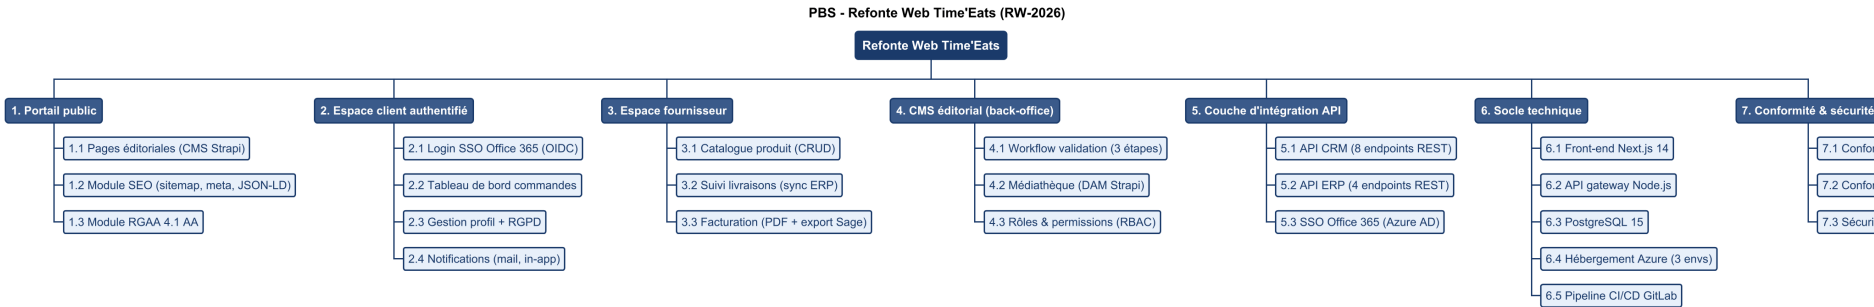

Source : pbs_refonte_web.puml — régénération : plantuml pbs_refonte_web.puml.

3 — Décomposition détaillée (niveau 3)

Code	Sous-système	Composant	Éléments / contenu
1	Portail public		Visiteurs anonymes, 50k visites/mois cible
1.1		Pages éditoriales (CMS)	12 templates : accueil, offre B2B, offre B2C, presse, recrutement, blog, contact, mentions légales, RGPD, cookies, accessibilité, plan du site
1.2		Module SEO	Sitemap XML auto, balises meta dynamiques, JSON-LD (Organization, Article, FAQ), redirections 301 depuis ancien site
1.3		Module RGAA	Skip links, contraste $\geq 4.5 : 1$, focus visible, navigation clavier, attributs ARIA, déclaration d'accessibilité
2	Espace client		Clients B2B et B2C authentifiés
2.1		Login SSO Office 365 (OIDC)	Authentification via Azure AD, MFA optionnelle, refresh token, logout SSO
2.2		Tableau de bord commandes	Historique commandes 24 mois, suivi en cours, téléchargement factures PDF, réabonnement 1-clic
2.3		Gestion profil + RGPD	Édition coordonnées, préférences notifications, export données personnelles (JSON), suppression compte
2.4		Notifications	Templates mail (SendGrid), in-app (websocket), préférences par canal
3	Espace fournisseur		Restaurateurs / traiteurs partenaires
3.1		Catalogue produit (CRUD)	Création / édition / désactivation produit, photos (max 5), allergènes, prix HT/TTC, stock indicatif
3.2		Suivi livraisons	Synchro temps réel avec ERP (statut Préparation / Expédié / Livré), preuve de livraison PDF
3.3		Facturation	Génération automatique facture mensuelle PDF, export comptable CSV, relances automatiques J+30
4	CMS éditorial		Équipe marketing (4 personnes)
4.1		Workflow validation	Brouillon → Relecture → Publication, notification email, historique versions (10 dernières)
4.2		Médiathèque (DAM)	Strapi assets, ré-encodage automatique (WebP, AVIF), 3 tailles responsives, recherche full-text
4.3		Rôles / permissions	4 rôles : Rédacteur, Relecteur, Administrateur, Super-admin (RBAC)
5	Couche API		Interopérabilité avec SI Time'Eats
5.1		API CRM	8 endpoints REST JSON : GET/POST comptes, GET/POST contacts, GET opportunités, POST leads, GET catalogue, POST commande
5.2		API ERP	4 endpoints REST : GET produits, GET stocks, POST factures, GET statut livraison
5.3		SSO Azure AD	OIDC, scopes openid profile email, app registration Azure AD, certificats
6	Socle technique		Stack et infrastructure
6.1		Front-end Next.js 14	SSR, ISR pour pages CMS, App Router, Tailwind CSS, TypeScript strict
6.2		API gateway Node.js	Express 4, validation Zod, rate limiting, JWT validation, logs structurés
6.3		PostgreSQL 15	32 tables, migrations Prisma, RGPD : anonymisation J+1825
6.4		Utilisation d'...	...

4 — Correspondance PBS ↔ autres documents

Sous-système PBS	Lots WBS (P2-06)	Exigences CDC (P1-02ter)
1. Portail public	WP-3, WP-4	FX-01 à FX-05, NFX-01 (perf), NFX-02 (RGAA)
2. Espace client	WP-5, WP-6	FX-06 à FX-10, NFX-03 (SSO)
3. Espace fournisseur	WP-7	FX-11 à FX-13
4. CMS éditorial	WP-8	FX-14 à FX-16
5. Couche API	WP-9, WP-10	FX-17, FX-18, NFX-04 (contrats API)
6. Socle technique	WP-1, WP-2, WP-11	NFX-05 (perf), NFX-06 (dispo), NFX-07 (compat)
7. Conformité & sécu	WP-12	FX-19, FX-20, NFX-08 à NFX-10

✓ Recommandation

Périmètre stable au J0 (kick-off, 22/04/2026) — toute évolution du PBS (ajout / suppression de composant) doit faire l'objet d'une demande de changement formelle (P3-14) impactant le baseline scope / coût / délai. La couche **App mobile clients / fournisseurs** *n'est pas* dans ce PBS : projets dédiés du portefeuille (cf. §1.5 du livrable PMO).
